



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS  
Subsecretaria de Infraestrutura  
Diretoria de Gestão de Convênios

DGC - 229/16


Belo Horizonte, 14 de abril de 2016.

REF.: Convênio nº 5191000053/2016  
Melhoramento de Vias Públicas.


Senhor (a) Prefeito (a);

Estamos encaminhando a V. Exa. para os devidos fins, a cópia do convênio em referência, acompanhado da cópia do plano de trabalho e cópia de sua publicação no Diário Oficial do Estado de "Minas Gerais", convênio este celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas e o Município de , **NATÉRCIA**.

Atenciosamente,

  
**ADAIR CARLOS DE SOUZA SOARES**  
Diretor de Gestão de Convênios

  
**HARRISON BARROSO LANA**  
Superintendente de Infraestrutura Municipal

  
**FABIANA DE CASTRO RASO**  
Subsecretária de Infraestrutura

Exmo. (a) Sr. (a)  
Prefeito (a) Municipal  
**NATÉRCIA - MG**

CONVÊNIO N.º 519100053 /2016

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A E O MUNICÍPIO DE NATÉRCIA, COM A INTERVENIÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, PARA OS FINS NELE ESPECIFICADOS.

A **MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A**, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.296.342/0001-29, com sede em Belo Horizonte/MG, na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Prédio Gerais, 6º andar, Rodovia Prefeito Américo Gianetti, 4001, Bairro Serra Verde, CEP 31.630-901, neste ato representada por dois de seus Diretores, abaixo assinados, na forma do Estatuto Social, **Mário Assad Júnior**, Diretor-Presidente, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n.º MG-2.064.367, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º 537.249.416-68; residente e domiciliado na Rua Dr. Astolfo Vieira de Resende, 32, apartamento 702, Bairro Sion; em Belo Horizonte/MG, CEP 30.315-510, **Paulo Roberto de Araújo**, Diretor Vice-Presidente, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade n.º MG-57.213, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º 124.536.926-15; residente e domiciliado na Rua Maranhão, 1622, apartamento 1500, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.150-331, **Walmir Pinheiro de Faria**, Diretor de Relações com Investidores, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade n.º M-830.297, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º 221.789.026-34, residente e domiciliado na Rua Cláudio Manoel, 1011, apartamento 301, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.140-100, **Carlos Gomes Sampaio de Freitas**, Diretor de Suporte ao Desenvolvimento Estadual, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade n.º M-95.249, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º 137.387.046-04, residente e domiciliado na Rua Tapuias, 39, apartamento 301, Bairro Floresta, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.150-030, **Leandro Ramon Campos Gusmão**, Diretor Administrativo, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/MG sob o n.º 106.462, portador da cédula de identidade n.º MG-11.080.092, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º 045.219.526-82, residente e domiciliado na Rua Santa Marta, 280, apartamento 204, bloco 01, Bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte/MG, CEP 31.030-090, doravante denominado **CONCEDENTE** e o **MUNICÍPIO DE NATÉRCIA**, inscrito no CNPJ sob o n.º 17.935.412/0001-16, com sede na Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro nº 100, Centro, CEP nº 37.524-000, neste ato representado por seu Prefeito, **Cristiano Antônio Caetano Junho**, residente e domiciliado no Sítio Santo Antônio, Bairro Atirado - Zona Rural, CEP nº 37.524-000, portador da cédula de identidade n.º M-2.578.668, emitida pelo SSPMG, inscrito no CPF sob o n.º 446.408.896-15, doravante denominado **CONVENIENTE**, com a interveniência do **ESTADO DE MINAS GERAIS**, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.715.581/0001-03, com sede em Belo Horizonte/MG, na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Prédio Minas, 7º andar, Rodovia Prefeito Américo Gianetti, 4143, Bairro Serra Verde, CEP 31.630-900, neste ato representada por seu Secretário, **Murilo de Campos Valadares**, brasileiro, cas. av.div Iv 20b fl-174 v, engenheiro civil, portador da cédula de identidade n.º MG-148.360, inscrito no CPF sob o n.º 216.984.226-87, residente e domiciliado na Rua Viamão, nº 643, apto nº 31, Bairro Alto Barroca, Belo Horizonte/MG, CEP 30.431-020 e pela sua Subsecretária de Infraestrutura, **Fabiana de Castro Raso**, residente na Rua Bolívia nº 539, apto 101, Bairro São Pedro, portadora da CI nº M.8.922.959 e do CPF nº 013.367.956-03, doravante denominada **INTERVENIENTE**, **CONSIDERANDO**:

- que a **MGI** foi eleita parceira do Estado para agregar eficiência na gestão e execução da realização de ações de investimentos no âmbito da própria Administração Estadual, além de

possuir em seu objeto social a finalidade de promover ações que visem ao desenvolvimento econômico e social do Estado, em conjunto com os órgãos e entidades da administração pública estadual, por meio da realização de convênios ou outros instrumentos congêneres, com vistas à contratação, construção, ampliação, aquisição e cessão de bens móveis e/ou imóveis, bem como a execução ou a contratação de pesquisa, projeto, obra, serviço ou empreendimento de interesse da Administração Pública Estadual, conforme art. 2º, inciso IX, do Estatuto Social da **MGI**;

- que foi celebrado Termo de Cooperação Técnica, entre **MGI** e **SETOP**, definindo as atribuições para a celebração e execução de convênios ou instrumentos congêneres em que figurem estas instituições;
- que a **SETOP** tem como missão, dentre suas competências institucionais legalmente estatuídas, implementar soluções integradas de transporte e obras para garantia da mobilidade e acessibilidade de bens e pessoas e a realização das políticas públicas do Estado de Minas Gerais;
- a competência e a expertise da **SETOP** na execução da política pública de infraestrutura municipal é a necessidade de compartilhar tal expertise com outras entidades da Administração Estadual, como é o caso da **MGI**;

**RESOLVEM**, com base na legislação vigente, em especial as Leis Federais n.º 4.320/1964 e 8.666/1993, Leis Delegadas Estaduais n.º 179/2011 e 180/2011, Leis Estaduais n.º 18.692/2009 e 20.373/2012, Decreto Estadual n.º 46.319/2013, Resolução Conjunta SEGOV/AGE n.º 002/2013, 004 e 005/2015, Resolução SETOP n.º 027/2011, Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG vigente, Lei Anual de Diretrizes Orçamentárias, Instrução Normativa n.º 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, celebrar o presente **CONVÊNIO DE SAÍDA**, mediante as seguintes cláusulas e condições, previamente entendidas e expressamente aceitas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Constitui objeto do presente **CONVÊNIO DE SAÍDA** a conjugação de esforços, com atuação harmônica e sem intuito lucrativo, para a execução de calçamento de vias públicas, conforme Plano de Trabalho, devidamente aprovado pela **CONCEDENTE** com apoio da **INTERVENIENTE** e parte integrante deste instrumento, para todos os fins de direito, na condição de seu anexo.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE**

Constitui finalidade do presente **CONVÊNIO DE SAÍDA** para melhoramento de vias públicas.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES**

##### **I - Compete à CONCEDENTE:**

- a) Receber da **INTERVENIENTE** a documentação necessária do processo administrativo contendo a proposta formal de celebração do instrumento e/ou aditamento, devidamente autuado e instruído com a documentação exigida na legislação aplicável aos convênios de saída, bem como contendo os pareceres que atestem a viabilidade técnica e jurídica da proposta; para providenciar assinaturas da diretoria da **MGI**;
- b) Aprovar, em conjunto com a **INTERVENIENTE**, o Plano de Trabalho proposto pelo **CONVENIENTE**, bem como eventuais alterações, desde que permitidas em lei e que não impliquem a alteração

do objeto pactuado, conforme art. 51 do Decreto nº 46.319/13, mediante pareceres técnicos e jurídicos favoráveis da INTERVENIENTE;

- c) Repassar os recursos financeiros ao CONVENIENTE necessários à execução do objeto previsto na Cláusula Primeira deste convênio de saída, conforme cronograma de desembolso financeiro apresentado no Plano de Trabalho, exceto nos casos previstos no § 3º do art. 116 da Lei Federal nº 8.666/1993 e art. 42 da Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015, através de conta aberta especificamente para os fins de administração dos recursos do objeto deste instrumento;
- d) Encaminhar à INTERVENIENTE as vias do convênio de saída após a assinatura dos partícipes;
- e) Comunicar à INTERVENIENTE sobre o pagamento das parcelas do convênio de saída, bem como encaminhar as cópias dos comprovantes de transferência bancária para instrução dos processos;
- f) Requisitar vistorias do objeto do convênio, quando de interesse da CONCEDENTE, utilizando-se da expertise da INTERVENIENTE, nos termos da Lei 8666/93, Decreto Estadual 43.635/2003 e Decreto Estadual 46.319/2013 e Resoluções Conjuntas SEGOV/AGE 002/2013 e 004/2015;
- g) Receber o parecer técnico da INTERVENIENTE relativo à análise da documentação encaminhada pelo CONVENIENTE que versa sobre o monitoramento da execução deste convênio de saída;
- h) Receber e analisar a prestação de contas do convênio de saída, após nota técnica emitida pela INTERVENIENTE sugerindo sua aprovação, aprovação com ressalvas ou reprovação, para as providências de arquivamento ou abertura de procedimento específico à regularização, se apuradas irregulares, mantendo o processo físico de prestação de contas à disposição dos órgãos de controle interno e externo, para futuras ou eventuais inspeções;
- i) Consultar o CADIN e instaurar processo junto ao TCE/MG;
- j) Registrar e dar baixa contábil no convênio de saída.

II - compete ao CONVENIENTE:

- a) Incluir o Plano de Trabalho no SIGCON – SAÍDA e encaminhar à INTERVENIENTE a documentação necessária à celebração e/ou aditivos deste convênio de saída;
- b) Cumprir fielmente o Plano de Trabalho aprovado pela CONCEDENTE e INTERVENIENTE, parte integrante deste instrumento como anexo;
- c) Depositar o valor da contrapartida financeira na mesma conta do convênio conforme Cláusula Quarta, Subcláusula Quinta;
- d) Responsabilizar-se pela cobertura dos custos que eventualmente excederem o valor constante da Cláusula Quarta;
- e) Manter, obrigatória e exclusivamente, os recursos financeiros de que trata a Cláusula Quarta depositados na conta bancária específica do CONVÊNIO DE SAÍDA, cuja abertura deve se dar em Banco Oficial nos termos do 9º da Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015;
- f) Manter aplicados os recursos enquanto não utilizados, nos termos do § 1º do art. 38 do Decreto Estadual nº 46.319/2013;

- g) Observar que as receitas auferidas decorrentes da aplicação dos recursos serão obrigatoriamente computadas a crédito do CONVÊNIO DE SAÍDA, podendo ser aplicadas, exclusivamente, em seu objeto, observado o § 3º do art. 38 do Decreto Estadual nº 46.319/2013;
- h) Manter atualizados o correio eletrônico, o telefone de contato e o endereço, inclusive o residencial de seu representante legal, no Cadastro Geral de Convenientes – CAGEC;
- i) Informar ao INTERVENIENTE qualquer alteração na equipe executora do CONVÊNIO DE SAÍDA, a qual também será responsável por prestar informações sobre o instrumento e sua execução;
- j) Executar e monitorar, diretamente ou por terceiros, o objeto deste CONVÊNIO DE SAÍDA, em conformidade com seu Plano de Trabalho e observada a legislação pertinente, em especial a Lei Federal nº 8.666/1993 e dispositivos relativos à segurança, higiene e medicina do trabalho;
- k) Efetuar os pagamentos aos contratados e fornecedores por meio de cheque nominal, ordem bancária ou, preferencialmente, transferência eletrônica disponível, em que fiquem identificados sua destinação e o credor, vedado qualquer pagamento em espécie;
- l) Não realizar despesas anteriores ou posteriores ao prazo de vigência do presente CONVÊNIO DE SAÍDA ou em outras situações vedadas, observados os arts. 35, 35-A e 36 do Decreto Estadual nº 46.319/2013, sob pena de glosa de despesas e/ou reprovação da prestação de contas;
- m) Apresentar à CONCEDENTE relatórios de monitoramento, semestralmente, sobre a execução do presente CONVÊNIO DE SAÍDA, na forma do art. 36 da Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015, bem como prestar informações sobre a execução sempre que solicitado pelo CONCEDENTE ou órgãos fiscalizadores;
- n) Identificar eventuais necessidades de alteração do CONVÊNIO DE SAÍDA e apresentá-las previamente à CONCEDENTE, observada a Cláusula Nona, Subcláusula Primeira, deste instrumento;
- o) Facilitar o acesso de servidores ou parceiros do CONCEDENTE, quando em missão de vistoria, fiscalização ou auditoria, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com a execução do CONVÊNIO DE SAÍDA, conforme Cláusula Sexta, Subcláusula Segunda;
- p) Divulgar o convênio para a comunidade beneficiada de acordo com o padrão do Manual de Identidade Visual, disponível no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Governo – SEGOV – [www.governo.mg.gov.br](http://www.governo.mg.gov.br), através de placa.
- q) Divulgar o CONVÊNIO DE SAÍDA em sítio eletrônico próprio e em quadros de avisos de amplo acesso público, observada as determinações da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e do art. 61 do Decreto Estadual nº 45.969, de 24 de maio de 2012;
- r) Não permitir que constem, em nenhum dos bens adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com recursos do CONVÊNIO DE SAÍDA, nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, bem como veiculação de publicidade ou propaganda, cumprindo assim o que determina o § 1º do art. 37 da Constituição Federal de 1988 e o art. 37 da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;

- s) Conservar os bens adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com recursos do CONVÊNIO DE SAÍDA e responsabilizar-se pela sua guarda, manutenção, conservação e bom funcionamento, obrigando-se a informar à CONCEDENTE, a qualquer época e sempre que solicitado, a localização e as atividades para as quais estão sendo utilizados;
- t) Manter sigilo acerca das informações a que tenha acesso em virtude do presente CONVÊNIO DE SAÍDA, ainda que após o término da vigência, salvo quando expressamente autorizado pelo(a) CONCEDENTE ou em virtude de legislação específica;
- u) Prestar contas, parcial ou final, dos recursos do CONVÊNIO DE SAÍDA, inclusive da contrapartida, nos moldes e prazos previstos na Cláusula Sétima, no Capítulo VII do Decreto Estadual nº 46.319/2013 e no Capítulo VII da Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015, observada a documentação específica para o tipo de objeto do presente instrumento;
- v) Devolver ao Tesouro Estadual, na proporcionalidade dos recursos transferidos e da contrapartida, os saldos em conta corrente e de aplicação financeira, por meio de Documento de Arrecadação Estadual – DAE, até 30 (trinta) dias após o término da vigência;
- w) Responsabilizar-se pelo recolhimento aos órgãos competentes de todos os impostos, taxas, encargos, tributos sociais, trabalhistas e previdenciários, e comprová-lo na prestação de contas, eximindo a CONCEDENTE e a INTERVENIENTE da responsabilidade solidária, bem como da responsabilidade técnica, civil e criminal decorrentes da execução de obras e serviços;
- x) Responder, diretamente, por qualquer obrigação trabalhista ou previdenciária intentada contra a CONCEDENTE ou contra a INTERVENIENTE oriunda de qualquer membro da equipe do CONVENIENTE;
- y) Assumir, exclusivamente, a responsabilidade técnica e civil pela reforma ou obra relativa ao objeto do CONVÊNIO DE SAÍDA;
- z) Observar, durante a elaboração dos projetos e da execução da reforma ou obra, a Lei Federal nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, a Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, o Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, e a Lei Estadual nº 15.426, de 3 de janeiro de 2005;
- aa) Incluir os recursos financeiros recebidos da CONCEDENTE no orçamento municipal, classificando-os na dotação orçamentária específica, de acordo com o objeto do presente CONVÊNIO DE SAÍDA;
- bb) Promover o competente processo licitatório ou de dispensa ou inexigibilidade de licitação, para contratação de execução do objeto do presente instrumento, conforme determina a Lei Federal nº 8.666/1993 e a Lei Federal nº 10.520/2002, em tempo hábil, observada a vigência do convênio;
- cc) cumprir as normas estabelecidas nas Instruções Normativas nº 09/2003 e nº 06/2013 do TCEMG, mantendo toda a documentação devidamente ordenada e atualizada.

III - Compete à INTERVENIENTE:

- a) Receber a documentação do CONVENIENTE com fins de instruir o processo do convênio de saída e seus posteriores aditamentos;
- b) Apoiar o CONCEDENTE na análise e aprovação do Plano De Trabalho proposta pelo CONVENIENTE, no SIGCON-Saída, para a celebração deste CONVÊNIO DE SAÍDA, através da emissão de pareceres técnico e jurídico;
- c) Elaborar minuta de convênio de saída e/ou aditamentos em nome da CONCEDENTE com interveniência da INTERVENIENTE;
- d) Dar suporte ao CONCEDENTE na ciência à Câmara Municipal da assinatura deste CONVÊNIO DE SAÍDA, conforme art. 116, §2º, da Lei Federal nº 8.666/1993;
- e) Dar suporte ao CONCEDENTE no acompanhamento e fiscalização da execução deste CONVÊNIO DE SAÍDA, consoante art. 67 c/c art. 116, §3º, inciso I, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Estadual nº 46.319/2013 e Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 002/2013;
- f) Acompanhar, em conjunto com o CONCEDENTE, as inserções realizadas pelo CONVENIENTE no SIGCON-Saída referentes ao monitoramento deste CONVÊNIO;
- g) Analisar e recomendar em conjunto com a CONCEDENTE reformulações no Plano de Trabalho, as quais deverão ser materializadas por meio de aditamento a este CONVÊNIO, se for o caso, quando solicitado pelo CONVENIENTE, desde que tal reformulação seja permitida em lei e que não implique em alteração do objeto deste CONVÊNIO;
- h) Desenvolver as ações necessárias à formalização, pelo CONCEDENTE, das prorrogações de ofício os termos autorizados pela norma;
- i) Repassar ao CONVENIENTE vigas e bueiros, quando necessários à execução do objeto deste CONVÊNIO DE SAÍDA, de acordo com o projeto, cronograma de execução e planilha orçamentária apresentados e aprovados pela área técnica da SETOP;
- g.1 A autorização de doação de vigas metálicas somente será expedida mediante a apresentação de laudo que comprove o estágio das obras, o qual exija a aplicação das mesmas;
- j) Apoiar o CONCEDENTE nas vistorias/ fiscalização das obras de infraestrutura objeto deste CONVÊNIO DE SAÍDA, em observância ao cronograma físico-financeiro;
- k) Comunicar ao CONCEDENTE, para as devidas providências, sobre quaisquer inconformidades ou irregularidades acerca da execução deste CONVÊNIO DE SAÍDA pelo CONVENIENTE, as quais tenham sido apuradas quando do acompanhamento e fiscalização;
- l) Comunicar ao CONCEDENTE, para as devidas providências, sobre eventuais descumprimentos, pelo CONVENIENTE, de prazos ou não encaminhados à SETOP de documentos relativos ao CONVÊNIO DE SAÍDA, em especial os referentes ao monitoramento ou acompanhamento e prestação de contas final;

- m) Apoiar a CONCEDENTE na análise da prestação de contas deste CONVÊNIO DE SAÍDA, emitindo nota técnica recomendando a sua aprovação, aprovação com ressalva ou reprovação, após encaminhar a MGI;
- n) Publicar no Diário Oficial o extrato dos convênios e seus aditivos;
- o) Informar à CONCEDENTE quando do recebimento da prestação de contas final do convênio;
- p) Manter toda a documentação relativa ao convênio de saída firmado pela CONCEDENTE arquivado em processo físico;
- q) Encaminhar ou permitir acesso dos servidores da CONCEDENTE ou terceiros contratados por esta aos processos físicos do convênio de saída, caso requerido, com fins de atender ao acompanhamento e monitoramento da execução ou requerimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Ministério Público ou Poder Judiciário.

#### CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para a execução do objeto deste CONVÊNIO DE SAÍDA serão alocados recursos no valor total de R\$507.597,08 (quinhentos e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e oito centavos), assim discriminados:

- a) R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de repasse do Tesouro do Estado a ser realizado pela CONCEDENTE;
- b) R\$7.597,08 (sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e oito centavos) a título de contrapartida financeira do CONVENENTE, correspondente ao percentual de (1,50%), conforme previsto na Lei Anual Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:** Os recursos a serem repassados pelos partícipes, inclusive os relativos à contrapartida financeira, serão depositados, integralmente, na Conta Bancária nº 12.558-X, Agência nº 4063-0, Banco do Brasil, vinculada ao CONVÊNIO DE SAÍDA, indicada pelo CONVENENTE na Caracterização da Proposta do Plano de Trabalho, em quantas parcelas estiverem previstas no Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA:** A liberação de recursos pela CONCEDENTE ocorrerá mediante a observação do Cronograma de Desembolso, monitoramento das obras e da legislação eleitoral, bem como a verificação da efetiva disponibilidade financeira e da adimplência e regularidade do CONVENENTE, conforme art. 35 da Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015 e Resolução SETOP nº 035/2010.

**SUBCLÁUSULA TERCEIRA:** Havendo mais de uma liberação, a comprovação de que os recursos anteriormente repassados foram rigorosamente aplicados no objeto do CONVÊNIO DE SAÍDA deverá ocorrer como condição para liberação das parcelas subsequentes, conforme disposto nos arts. 39 e 40 do Decreto Estadual nº 46.319/2013 e nos arts. 33 e 34 da Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015, não isentando o CONVENENTE da obrigação de efetuar a prestação de contas final, após o término da execução do objeto, no mesmo prazo e condições estipuladas na Cláusula Sétima.

**SUBCLÁUSULA QUARTA:** Se o CONVÊNIO DE SAÍDA versar sobre reforma ou obra, a placa referida na Cláusula Terceira, inciso II, alínea "p", deve ser inserida após a celebração e é condicionante para a liberação da segunda parcela.

**SUBCLÁUSULA QUINTA:** A contrapartida financeira, caso existente, será depositada, nos termos da Subcláusula Primeira, na conta bancária específica do convênio de saída e em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso, constante do plano de trabalho até o final do mês subsequente ao recebimento da parcela de recursos repassados pela CONCEDENTE. Caso o depósito ocorra em data posterior ao prazo definido nesta Cláusula, o valor da contrapartida financeira deverá ser atualizado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC – a partir da data do recebimento dos recursos, nos termos do § 3º do art. 60 da Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015.

**SUBCLÁUSULA SEXTA:** Em se tratando de contrapartida não financeira, essa deverá ser comprovada no ato da prestação de contas final do CONVÊNIO DE SAÍDA, devendo ainda ser observada a memória de cálculo apresentada juntamente com a Proposta de Plano de Trabalho, quanto à especificação, quantificação e o custo unitário dos bens ou serviços que venham a ser utilizados.

**SUBCLÁUSULA SÉTIMA:** Havendo diferença a maior em relação ao valor indicado no *caput* desta Cláusula e o efetivamente necessário à execução do objeto deste CONVÊNIO DE SAÍDA, a contrapartida deverá ser complementada até ao valor da diferença apurada para a execução do objeto conveniado, ficando assim sob a responsabilidade exclusiva do CONVENIENTE, que a comprovará na prestação de contas, nos termos da Cláusula Sétima.

**SUBCLÁUSULA OITAVA:** Os recursos do CONVÊNIO DE SAÍDA somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas previstas neste instrumento e no Plano de Trabalho, devendo a movimentação financeira ser realizada conforme subitem “k”, item II, da Cláusula Terceira, observadas as vedações do art. 35 do Decreto Estadual nº 46.319/2013 e as exigências dos arts. 44 a 47 da Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Os recursos financeiros a serem repassados correrão à conta de recursos próprios da MGI e os relativos à contrapartida na dotação nº 0209011545100091.039449051 do MUNICÍPIO consignada para o presente exercício ou nas subseqüentes para os exercícios posteriores.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO**

O CONVENIENTE apresentará a CONCEDENTE, até o décimo dia do mês subsequente ao primeiro semestre de vigência, relatório de monitoramento do CONVÊNIO DE SAÍDA para demonstrar o cumprimento do cronograma e das metas estabelecidas no Plano de Trabalho, conforme regras definidas no art. 36 da Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015.

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:** a CONCEDENTE deverá orientar, acompanhar e fiscalizar a execução do CONVÊNIO DE SAÍDA, analisando os relatórios de monitoramento e as prestações de contas parciais e efetuando vistorias conforme arts. 39 a 42 da Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015, com vistas a assegurar a correta aplicação dos recursos públicos e a suspender a liberação quando verificadas impropriedades, bem como notificar o CONVENIENTE para apresentação de justificativa ou saneamento das irregularidades.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA:** Os servidores da CONCEDENTE, seus parceiros e representantes do sistema de controle interno estadual terão acesso, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com este instrumento, quando em missão de fiscalização ou auditoria.

**SUBCLÁUSULA TERCEIRA:** A CONCEDENTE poderá assumir a responsabilidade sobre a execução do CONVÊNIO DE SAÍDA para evitar a descontinuidade de seu objeto, no caso de paralisação.

### CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O CONVENIENTE apresentará à CONCEDENTE prestação de contas:

- a) **PARCIAL:** quando a liberação dos recursos ocorrer em 3 (três) ou mais parcelas, sendo que a liberação da terceira e seguintes ficará condicionada à apresentação e/ou aprovação das contas referentes às parcelas anteriores, nos termos dos arts. 39, 40 e 41 do Decreto Estadual nº 46.319/2013 e arts. 33 e 34 da Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015;
- b) **FINAL:** até 90 (noventa) dias após o término da vigência do CONVÊNIO DE SAÍDA, em conformidade com os arts. 54 a 64 do Decreto Estadual nº 46.319/2013, com o Decreto Estadual nº 46.830, de 14 de setembro de 2015, e com os arts. 55 a 66 da Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015, atendendo às instruções a CONCEDENTE.

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:** As prestações de contas serão constituídas pela documentação listada nos arts. 55 a 58 da Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA:** As despesas serão comprovadas mediante encaminhamento, à CONCEDENTE, de documentos originais fiscais ou equivalentes, em primeira via ou documento equivalente, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos em nome do CONVENIENTE, devidamente identificados com referência ao nome da CONCEDENTE e ao número do CONVÊNIO DE SAÍDA, observado os § 1º do art. 55 do Decreto Estadual nº 46.319/2013 e o art. 46 da Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015.

**SUBCLÁUSULA TERCEIRA:** Não serão aceitos documentos ilegíveis, com rasuras ou com prazo de validade vencido.

**SUBCLÁUSULA QUARTA:** Cabe à CONCEDENTE e, se extinto, a seu sucessor, promover a conferência da documentação apresentada, adotar as medidas administrativas internas, notificar o CONVENIENTE para saneamento das irregularidades e eventual devolução de recursos e emitir pareceres técnico e financeiro, aprovando, com ou sem ressalvas, ou reprovando a prestação de contas, bem como promover o arquivamento dos processos, que ficarão à disposição dos órgãos fiscalizadores.

**SUBCLÁUSULA QUINTA:** Se verificadas, a qualquer tempo, omissão no dever de prestar contas parcial ou impropriedades na execução do CONVÊNIO DE SAÍDA vigente, a CONCEDENTE suspenderá a liberação dos recursos e notificará o(a) CONVENIENTE, fixando o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogável uma vez, por igual período, a critério do CONCEDENTE, para apresentação de justificativa ou saneamento das irregularidades, sob pena de rescisão unilateral e instauração de tomada de contas especial e demais medidas cabíveis.

**SUBCLÁUSULA SEXTA:** Constatadas quaisquer irregularidades após a análise da prestação de contas final, a CONCEDENTE notificará o CONVENIENTE, fixando o prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da data do recebimento da notificação, para saneamento das irregularidades ou devolução dos recursos, atualizados nos termos do art. 60 da Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015, sob pena de inscrição no Sistema Integrado da Administração Financeira – SIAFI/MG.

**SUBCLÁUSULA SÉTIMA:** A não apresentação da prestação de contas final no prazo determinado ou a reprovação da prestação de contas em sede de Processo Administrativo de Constituição do Crédito Estadual não Tributário decorrente de dano ao erário apurado em prestação de contas de

transferências de recursos financeiros mediante parcerias – PACE – Parcerias – observados o Decreto Estadual nº 46.830/2015, o § 9º do art. 61 do Decreto Estadual nº 46.319/2013 e os arts. 62 e 63 da Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015, determinará as seguintes providências, por parte da CONCEDENTE:

- a) registrar a inadimplência no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI-MG –, se não tiver sido registrada anteriormente;
- b) inscrever o responsável pela causa da não aprovação da prestação de contas ou por sua omissão em conta de controle “Diversos Responsáveis em Apuração” no valor correspondente ao dano;
- c) baixar o registro contábil da parceria;
- d) encaminhar os autos à autoridade administrativa competente para instauração de tomada de contas especial; e
- e) o encaminhamento da cópia dos autos à Advocacia-Geral do Estado - AGE, na hipótese de ressarcimento ao erário, para as medidas administrativas e judiciais cabíveis.

#### CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

Este instrumento vigorará por 730 dias, a contar da data de sua publicação, computando-se, neste prazo, o previsto para execução do objeto do CONVÊNIO DE SAÍDA, podendo a vigência ser prorrogada observado o procedimento constante da Cláusula Nona.

#### CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES

O presente instrumento e seu Plano de Trabalho poderão ser alterados, mediante proposta de alteração de qualquer uma das partes e celebração de termo aditivo, sendo vedada a alteração que resulte na modificação do núcleo da finalidade do CONVÊNIO DE SAÍDA.

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:** A proposta de alteração deverá ser registrada pelo CONVENIENTE no Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais – SIGCON-MG – Módulo Saída com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias do término da vigência, levando-se em conta o tempo necessário para análises e decisão da CONCEDENTE.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA:** A proposta de alteração deverá ser formalizada e justificada, bem como observar os requisitos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos arts. 51 a 53 do Decreto Estadual nº 46.319/2013 e nos arts. 48 a 54 da Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015.

**SUBCLÁUSULA TERCEIRA:** A CONCEDENTE prorrogará de ofício a vigência do CONVÊNIO DE SAÍDA, mediante justificativa formalizada no SIGCON-MG – Módulo Saída, nos casos de atraso na liberação de recursos ou na execução, limitada a prorrogação ao exato período verificado ou previsão estimada de atraso.

**SUBCLÁUSULA QUARTA:** Quando a proposta de alteração para ampliação do objeto for apresentada após a conclusão de sua execução, nos termos do § 2º do art. 53 do Decreto Estadual nº 46.319/2013, o aditamento estará limitado ao valor da economia alcançada, vedada a adição de novos recursos financeiros.

**SUBCLÁUSULA QUINTA:** A alteração do CONVÊNIO DE SAÍDA relacionada exclusivamente a dotação orçamentária, aos membros da equipe executora, à conta bancária específica, à duração das etapas e à adequação do demonstrativo de recursos, não poderá acarretar a modificação da data de término da vigência, do valor, do objeto e do núcleo da finalidade, dispensando a formalização do termo aditivo, sendo necessário o registro no SIGCON-MG – Módulo Saída.

### CLÁUSULA DÉCIMA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

Os partícipes poderão, a qualquer tempo, denunciar ou rescindir este CONVÊNIO DE SAÍDA, mediante notificação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, em face de superveniência de impedimento que o torne formal ou materialmente inexecutável.

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:** Constitui motivo para rescisão unilateral a critério da CONCEDENTE, observado o art. 66 do Decreto Estadual nº 46.319/2013, as seguintes situações:

- a) A constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção insanável de informação em documento apresentado ao CAGEC ou na celebração do CONVÊNIO DE SAÍDA;
- b) A inadimplência pela CONVENIENTE de quaisquer das cláusulas pactuadas;
- c) O não cumprimento das metas fixadas ou a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho, sem prévia autorização da CONCEDENTE, ainda que em caráter de emergência;
- d) a aplicação financeira dos recursos em desacordo com o disposto no art. 38 do Decreto Estadual nº 46.319/2013;
- e) a utilização dos bens adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com recursos do CONVÊNIO DE SAÍDA em finalidade distinta ou para uso pessoal a qualquer título;
- f) a falta de apresentação de contas, nos prazos estabelecidos, ou a não aprovação da prestação de contas parcial;

g) a verificação de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificado pela CONCEDENTE;

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA:** Em qualquer das hipóteses de denúncia ou rescisão, ficam os partícipes vinculados às responsabilidades, inclusive de prestar contas, relativas ao prazo em que tenham participado do CONVÊNIO DE SAÍDA.

**SUBCLÁUSULA TERCEIRA:** Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de rendimentos de aplicações financeiras, deverão ser devolvidos aos partícipes, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e da contrapartida, independentemente da data em que foram aportados pelas partes, observado o § 6º do art. 116 da Lei Federal nº 8.666/1993.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PROPRIEDADE DOS BENS E DO DIREITO AUTURAL

Os bens adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com recursos do convênio destinam-se ao uso exclusivo do CONVENIENTE, para atendimento à comunidade e pessoas beneficiadas, sendo vedada a sua utilização para uso pessoal a qualquer título.

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:** Os bens adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com recursos do convênio incorporam-se automaticamente ao patrimônio do CONVENIENTE após a aprovação da prestação de contas final.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA:** A transferência do domínio do bem depende de vinculação à mesma finalidade do CONVÊNIO DE SAÍDA, de formalização de instrumento jurídico próprio pelo CONVENIENTE e de observância da legislação que rege a matéria. A transferência de domínio de bem móvel permanente em período inferior a cinco anos após a aprovação da prestação de contas, bem como de bem imóvel a qualquer tempo, depende, ainda, de autorização prévia da CONCEDENTE.

**SUBCLÁUSULA TERCEIRA:** Verificado o desvio de finalidade ou o uso pessoal, os bens adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com recursos do convênio deverão ser revertidos ao patrimônio da CONCEDENTE.

**SUBCLÁUSULA QUARTA:** O Estado de Minas Gerais será considerado coautor do programa, projeto ou atividade objeto do CONVÊNIO DE SAÍDA, para fins de definição dos direitos autorais, de imagem e de propriedade, inclusive intelectual, dos dados gerados e dos produtos desenvolvidos na execução do convênio.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA

O CONVÊNIO DE SAÍDA com Plano de Trabalho aprovado com ressalva técnica e/ou jurídica terá sua eficácia suspensa até que o CONVENIENTE apresente a documentação técnica e/ou jurídica relacionada nos pareceres respectivos.

**SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:** A eficácia do CONVÊNIO DE SAÍDA, inclusive a liberação de recursos, somente ocorrerá após a resolução das pendências pelo CONVENIENTE, que deverá ser atestada pelas áreas técnica e jurídica da CONCEDENTE.

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA:** A CONCEDENTE, após certificar o cumprimento das ressalvas técnica e/ou jurídica, inicialmente apontadas, emitirá ofício comunicando o CONVENIENTE sobre o término da condição suspensiva, liberando o repasse de recursos.

**SUBCLÁUSULA TERCEIRA:** A resolução da condição suspensiva deverá ocorrer no prazo máximo de 120 dias, contados a partir da publicação do CONVÊNIO DE SAÍDA, sob pena de rescisão, cabendo à CONCEDENTE acompanhar o cumprimento deste prazo.

**SUBCLÁUSULA QUARTA:** O CONVENIENTE, desde já e por este instrumento, reconhece que o não cumprimento das exigências relativas à análise técnica e/ou jurídica implicará, caso não seja equacionada, na rescisão unilateral de pleno direito do presente instrumento no interesse da CONCEDENTE.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

Para eficácia deste instrumento, a INTERVENIENTE providenciará a publicação do seu extrato no Órgão Oficial Minas Gerais, em consonância com as normas estatuídas no *caput* do art. 37 da Constituição Federal de 1988, no parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993 e no art. 30 do Decreto Estadual nº 46.319/2013.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Para dirimir qualquer questão decorrente deste instrumento, fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte – MG, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**SUBCLÁUSULA ÚNICA:** Sendo o CONVENIENTE Administração Pública Municipal, as causas e conflitos serão processados e julgados originariamente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos termos da alínea "j", do inciso I, do art. 106 da Constituição Estadual.

E, por estarem assim justas e avençadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo nomeadas.

Belo Horizonte, 05 de Abril

de 2016.

Diretor da MGI - Minas Gerais Participações

Carlos Gomes Sampaio de Freitas  
Diretor de Suporte ao Desenvolvimento Estadual

Diretor da MGI - Minas Gerais Participações

Paulo Roberto de Araújo  
Diretor Vice-Presidente

**CONCEDENTE**

CRISTIANO ANTÔNIO CAETANO JUNHO

Prefeito Municipal de Natércia

**CONVENIENTE**

MURILO DE CAMPOS VALADARES

Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas

**INTERVENIENTE**

FABIANA DE CASTRO RASO

Subsecretária de Infraestrutura

**INTERVENIENTE**

**TESTEMUNHAS:**

Elvira Gonçalves dos Santos

CI - MG 11.896.793

CPF: 061.490.676-33

31.585-100 - Nº 103 - BH/146

Nome legível: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

CI: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome legível: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

CI: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

[illegible][illegible][illegible][illegible]

PM/MT/CA/11PM Homologação PI nº 01/2018  
123212290113 Objeto: Aplicação de vacina trivalente  
influenza, contendo obrigatoriamente três tipos de cepas de  
combinação para atender a demanda do SUS no exercício  
de 01 de 01 de 2018, tema público a homologação do PI, acimen  
no 01 de 01 de 2018. Integral da homologação esta disponível no  
página gov.br

1 cm - 06.81  
2 cm - 06.81



## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS


Belo Horizonte, 07 de abril de 2016.

Prezado Prefeito,

Com os meus cumprimentos, comunico-lhe que o "Minas Gerais" de hoje publica, no Diário do Executivo, na página 46, coluna 02, o seguinte ato de seu interesse:

Extrato do Convênio nº 5191000053/2016; Convenientes: MGI e o [REDACTED] por intermédio da SETOP; Objeto: execução de calçamento em vias públicas; Valor: R\$ 507.597,08; Dotação Orçamentária: 0209011545100091.039449051; Assinatura: 05/04/2016; Vigência: 730 dias, a contar da data de publicação.

Continuo nesta Casa Legislativa à disposição e receba o meu abraço,

  
Deputado Dilzon Melo

Vice-Líder do Bloco Verdade e Coerência

✂

Solicito a gentileza de preencher os dados abaixo, para atualização de cadastro, e devolver ao nosso Gabinete.

**\*\*\* CASO JÁ TENHA REMETIDO, FAVOR DESCONSIDERAR. \*\*\***

Nome completo: ..... Aniversário: ...../.....  
Endereço: Rua ..... nº ..... aptº./casa .....  
Bairro: ..... Tel. ( ) ..... CEP: .....  
Município: .....  
e-mail: .....

GABINETE DO DEPUTADO DILZON MELO

Palácio da Inconfidência

Rua Rodrigues Caldas, 30 - 2º Andar - Sala 218 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG - CEP: 30190-921  
Tel: (031) 2108-7398 - Fax: (031) 2108-7413 - E-mail: [dep.dilzon.melo@almg.gov.br](mailto:dep.dilzon.melo@almg.gov.br)


Belo Horizonte, 10 de junho, de 2017.

Prezado Prefeito:

Com os meus cumprimentos, comunico-lhe que o "Minas Gerais" de hoje publica, no Diário do Executivo, na página 162, coluna 02, o seguinte ato de seu interesse:

Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 191/000053/2016; Convenientes: SETOP e o Município de [redacted]; Objeto: prorrogação de ofício da vigência do convênio; Vigência: 29/08/2018; Assinatura: 05/06/2017.

Continuo nesta Casa Legislativa à disposição e receba o meu abraço,

  
Deputado Dilzon Melo

X.....

Solicito a gentileza de preencher os dados abaixo, para atualização de cadastro, e devolver ao nosso Gabinete.

**\*\*\* CASO JÁ TENHA REMETIDO, FAVOR DESCONSIDERAR \*\*\***

Nome completo: ..... Aniversário: ...../.....  
Endereço: Rua ..... nº ..... aptº./casa .....  
Bairro: ..... Tel.( ) ..... CEP: .....  
Município: .....  
e-mail: .....

Gabinete do Deputado Dilzon Melo  
Palácio da Inconfidência

Rua Rodrigues Caldas, 30 – 2º andar – Sala 218 – Santo Agostinho – Belo Horizonte – MG – 30190-921  
Tel.: (31) 2108-7398 – Fax: (31) 2108-7413 – dep.dilzon.melo@almg.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas  
Subsecretaria de Infraestrutura  
Superintendência de Infraestrutura Municipal  
Diretoria de Gestão de Convênios

OFÍCIO DGC/TA Nº 626/17

Belo Horizonte, 29 de junho de 2017.

Senhor Prefeito (a),

Informamos que a vigência do Convênio nº **5191.000.053/2016**, celebrado entre esse Município e a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – SETOP foi prorrogada de ofício através do **1º Termo de Aditamento de Prazo até o dia 29/08/2018**, conforme **art. 51 § 2º do Decreto nº 46.319/2013**


Se mesmo com o novo prazo concedido, o Município identificar a necessidade de prorrogação da vigência do referido instrumento, deverá ser observado o prazo de **45 dias** antes do término da vigência para a nova solicitação de termo aditivo, conforme legislação em vigor.


Ressaltamos que tal solicitação de termo aditivo deverá ser, instruída, sob pena de indeferimento do pedido, com todos os documentos abaixo relacionados:

- a) Ofício do Prefeito contendo justificativa detalhada e hábil a comprovar a necessidade de realizar o termo aditivo;
- b) Relatório de vistoria, datado e rubricado, emitido pelo responsável técnico da prefeitura, contendo a descrição dos serviços realizados, o percentual de sua execução, conforme Anexo I – Resolução SETOP nº 035/2010;
- c) Cronograma físico financeiro com prazo para finalização da obra, conforme modelo SETOP, assinado pelo responsável técnico e pelo prefeito;
- d) Cópia do extrato da movimentação dos recursos na conta corrente específica do convênio, com a comprovação de sua aplicação.

Importante destacar que o período a ser prorrogado, numa nova oportunidade, corresponderá exatamente ao tempo necessário para conclusão da obra/serviço e, **caso venha ocorrer a perda da vigência acima concedida, por falta de pedido em tempo hábil, a responsabilidade será única e exclusiva do município.**

Atenciosamente,

  
Adair Carlos de Souza Soares  
Diretor de Gestão de Convênios

  
Harrison Barroso Lana  
Subsecretário de Infraestrutura  
Substituto

Exmo.(a) Sr.(a)  
Prefeito(a) Municipal  
**NATÉRCIA – MG**



CONVENENTE

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL NATERCIA

Convênio Nº: 5191.000.053/2016

Nº da Alteração: 01/PO

Trata-se de prorrogação de ofício da vigência do convênio acima descrito, tendo em vista o atraso na liberação de recursos da 2ª parcela conforme o cronograma de desembolso do plano de trabalho.

Data limite prevista para pagamento: 05/09/2016


Data do pagamento realizado: 27/01/2017

Número de dias para a prorrogação (limitado ao período de atraso verificado na liberação dos recursos): 144

Vigência anterior: 07/04/2018

nova data de vigência do convênio: 29/08/2018

Dessa forma, manifesto-me favoravelmente à prorrogação de ofício.

  
Diretor da Área

Adair Carlos S. Soares  
Diretor de Gestão de Convênios  
MASP 1350.057-7  
Matrícula

31/03/2017  
Data

  
Superintendente da Área

Harrison Barroso Lana  
Superintendente de Infraestrutura Municipal  
MASP 1350.057-7  
Matrícula

31/03/2017  
Data

Considerando as informações acima submetidas à apreciação superior.

Belo Horizonte 31/03/17

Harrison Barroso Lana  
Subsecretário de Infraestrutura  
MASP 1350.057-7  
Subsecretário Substituto

Considerando as informações acima, autorizo a realização da prorrogação da vigência deste convênio nos termos legais.


Belo Horizonte 24/04/17

Murilo de Campos Valladares  
Secretário de Estado de  
Transportes e Obras Públicas  
Secretário

D - AUTORIZAÇÃO:

Considerando as informações acima, autorizo a realização da prorrogação da vigência deste convênio nos termos legais.

Belo Horizonte 05/08/17

  
Diretor da MGI

Vide 1214647-450V

  
Diretor da MGI

Carlos Gomes Sampaio de Freitas  
Diretor de Suporte ao Desenvolvimento Estadual

Antônio Valladares Bahia Neto  
Advogado - Assessor Jurídico  
OAB-MG 82.512

Paulo Roberto  
Diretor Vice-Presidente

Camila Diniz Utsch Carn  
Advogada - OABMG 91.839  
Matrícula 237





**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Governo  
Subsecretaria de Assuntos Municipais

OF/GAB/SUBSEAM/Nº 275 /2016


Belo Horizonte, 18 de abril de 2016

Senhor(a) Prefeito(a),

De ordem do Exmo. Sr. Governador, Fernando Damata Pimentel, comunicamos a realização de pagamento do seguinte convênio:

| Concedente | Interveniente | Conveniente | Convênio        | Valor da 1ª parcela |
|------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------|
| MGI        | SETOP         | Natércia    | 5191000053/2016 | R\$ 350000,00       |

Atenciosamente,

  
**MARCO ANTÔNIO VIANA LEITE**  
Subsecretário de Assuntos Municipais

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A)  
PREFEITO MUNICIPAL  
RUA GOVERNADOR VALADARES, 40 CENTRO- CEP 37524-000  
Natércia- MG



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Governo  
Subsecretaria de Assuntos Municipais

OF/GAB/SUBSEAM/Nº 64 /2017

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2017

Senhor(a) Prefeito(a)

De ordem do Governador Fernando Damata Pimentel, comunicamos o pagamento da 2ª parcela de convênio do Programa de Investimentos MGI, conforme quadro abaixo:

| Órgão     | Município | Convênio        | Valor da 2ª parcela |
|-----------|-----------|-----------------|---------------------|
| MGI/SETOP | NATÉRCIA  | 5191000053/2016 | R\$ 150.000,00      |

Atenciosamente,

**MARCO ANTÔNIO VIANA LEITE**  
Subsecretário de Assuntos Municipais

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A)  
CRISTIANO ANTONIO CAETANO JUNHO  
PREFEITO (A) MUNICIPAL  
RUA GOVERNADOR VALADARES, 40, CENTRO  
37524-000, NATÉRCIA - MG

**CONVENIO**

NÚMERO DE REGISTRO DO SIGCON-SAÍDA: 5191000053/2016

DATA DO REGISTRO: 21/03/2016

**I - IDENTIFICAÇÃO DO CONCEDENTE**

Razão social: MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 19.296.342/0001-29

Endereço: Rodovia Prefeito Américo Gianetti, nº 4.143

Bairro: SERRA VERDE

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30.315-510

Telefone: (31)3915-4840

E-mail do Setor de Convênio: subinfra@transportes.mg.gov.br

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL**

Nome completo: MÁRIO ASSAD JÚNIOR

CPF: 537.249.416-68

Cl/Órgao Exp.: SSP/MG/

Cargo: DIRETOR

Endereço residencial: Rua Dr. Astolfo Vieira de Resende, nº 32, apto. 702

Bairro: SION

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30.315-510

Telefone do setor de (31) 39158-344\_

E-mail setor de convênios: gegab@mgipart.com.br

**II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVENIENTE****DADOS DO CONVENIENTE**

Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

CNPJ: 17.935.412/0001-16

Endereço: PRAÇA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100

Bairro: CENTRO

Cidade: NATERCIA

UF: MG

CEP: 37.524-000

Telefone/ FAX: (35) 3456-1238

E-mail institucional: andreza\_pereira@hotmail.com

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL**

Nome completo: Cristiano Antônio Caetano Junho

CPF: 446.408.896-15

Cl/Órgao Exp.: m-2.578.668/sspmg

Cargo: Prefeito

Data de Vencimento do Mandato: 31/12/2016

Endereço residencial: Sítio Santo Antonio

Bairro: Atirado - Zona Rual

Cidade: NATERCIA

UF: MG

CEP: 37.524-000

Telefone pessoal: (35) 3456-1238

E-mail pessoal: prefeitura.natercia@hotmail.com

**III - IDENTIFICAÇÃO DO INTERVENIENTE****DADOS DO INTERVENIENTE**

Razão social: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS

CNPJ: 18.715.581/0001-03

Endereço: Rodovia Prefeito Américo Gianetti, nº 4.143

Bairro: SERRA VERDE

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 31.630-900

Telefone/ FAX: (031) 3915-8317

E-mail institucional: subinfra@transportes.mg.gov.br

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL**

Nome completo: MURILO DE CAMPOS VALADARES

CPF: 216.984.226-87

Cl/Órgao expedidor: MG-148.360

SSPMG

Cargo: SECRETARIO

Endereço residencial: Rua Viamão, 643, apto 31

Bairro: Alto Barroca

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30.431-020

Telefone pessoal: (31) 3915-8344

E-mail pessoal: gabinete@transportes.mg.gov.br

NÚMERO DE REGISTRO DO SIGCON-SAÍDA: 5191000053/2016

DATA DO REGISTRO: 21/03/2016

## IV - CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA

1 - Repasse de Natureza Especial? SIM

1.1 - Natureza Especial: REPASSE MGI

1.2 - Fundamentação legal para a natureza especial do repasse: Art. 22, §6º, do Decreto Estadual nº46.319/2013

2 - Origem dos recursos: Concedente - Contrapartida

2.1 - Selecionar Parlamentar:

2.2 - Contrapartida: Financeira

2.2.1 - Dotação Orçamentária da Contrapartida Financeira: 020901154510091.039449051

## 3 - TIPO DE ATENDIMENTO

## 4 - VALOR

| Gênero          | Categoria  | Especificação | Concedente     | Emenda   | Interveniente | Contrapartida |
|-----------------|------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|
| REFORMA OU OBRA | Calçamento | Vias Públicas | R\$ 500.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 7.597,08  |

## 5 - Descrição DETALHADA do objeto:

horamento de vias públicas com execução de retirada e reassentamento de piso de concreto intertravado, paralelepípedo e bloquete.

## 5.1 - Endereço da obra ou local do evento, de prestação do serviço ou de entrega do bem (dependendo do objeto):

| Rua/Avenida/<br>Rodovia/Beco/Travessa: | Número/KM: | Bairro/Distrito:                 | CEP        | Município: | Referência:   |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|---------------|
| Diversas Ruas                          | 1500       | Centro/ Chapada / Santa Catarina | 37.524-000 | NATERCIA   | Diversas Ruas |

## 6 - Justificativa FUNDAMENTADA, objetivos e finalidade do convênio de saída:

A implantação do retirada e reassentamento do calçamento nas vias públicas é de fundamental importância, e se faz necessária, devido às condições precárias das vias. Consequentemente, tal benfeitoria resultará numa melhoria na qualidade de vida dos habitantes e no desenvolvimento desta região.

## 7 - Pessoas beneficiadas diretamente

7.1 - Descrição: População

7.2 - Quantidade: 4821

8 - Proposta de vigência (dias corridos): 730

## 9 - Conta específica

| 9.1 - Banco: | 9.2 - Agência bancária: | 9.3 - Conta bancária: | 9.4 - Praça bancária: |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 4063-0                  | 12558-x               | Heliodora             |

## 9.4.1 - Justificativa de escolha de praça bancária diferente do município do conveniente (se for o caso):

No Município de Natercia não temos banco do Brasil

## 10 - Equipe executora do convênio de saída:

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

| 10.1 - NOME            | 10.2 - REGISTRO PROFISSIONAL | 10.3 - TELEFONE | 10.4 - E-MAIL       |
|------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|
| DANIELLE MAYRA DA CRUZ | 1296                         | (35) 3456-1238  | danyntc@hotmail.com |

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA DOCUMENTAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS

NÚMERO DE REGISTRO DO SIGCON-SAÍDA: 5191000053/2016

DATA DO REGISTRO: 21/03/2016

**10 - Equipe executora do convênio de saída:**

| 10.1 - NOME                     | 10.2 - REGISTRO PROFISSIONAL | 10.3 - TELEFONE | 10.4 - E-MAIL                    |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Cristiano Antônio Caetano Junho | 1089                         | (35) 3456-1238  | prefeitura.naterciac@hotmail.com |

**FUNÇÃO:** RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO

| 10.1 - NOME            | 10.2 - REGISTRO PROFISSIONAL | 10.3 - TELEFONE | 10.4 - E-MAIL       |
|------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|
| DANIELLE MAYRA DA CRUZ | 1296                         | (35) 3456-1238  | danyntc@hotmail.com |

**11 - Obrigações do interveniente (se houver):**

Análise técnica e jurídica para a celebração do convênio, acompanhamento e fiscalização da execução do convênio, e análise da prestação de contas.

**V - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO****ESPECIFICAÇÃO DA META:** 1 - REFORMA OU OBRA - Calçamento - Vias Públicas

| Especificação da etapa, fase ou atividade |                                            | IND. FÍSICO     |        | DURAÇÃO<br>(dias corridos) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------|
|                                           |                                            | UNID. DE MEDIDA | QUANT. |                            |
| 1                                         | Fornecimento e colocação de placa de obra. | Etapa           | 1,00   | 30                         |
| 2                                         | Calçamento em blocos de concreto.          | Etapa           | 1,00   | 90                         |
| 3                                         | Sarjeta                                    | Etapa           | 1,00   | 90                         |

**VI - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS****1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO**

| META               | Especificação da etapa, fase ou atividade  | UNID. DE MEDIDA | QUANT. | VALOR          |          |                       |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------------------|
|                    |                                            |                 |        | UNITÁRIO       | MENSAL   | TOTAL                 |
| 1                  | Fornecimento e colocação de placa de obra. | Etapa           | 1,00   | R\$ 1.437,37   | R\$ 0,00 | R\$ 1.437,37          |
| 1                  | Calçamento em blocos de concreto.          | Etapa           | 1,00   | R\$ 466.448,98 | R\$ 0,00 | R\$ 466.448,98        |
| 1                  | Sarjeta                                    | Etapa           | 1,00   | R\$ 39.710,73  | R\$ 0,00 | R\$ 39.710,73         |
| <b>VALOR TOTAL</b> |                                            |                 |        |                |          | <b>R\$ 507.597,08</b> |

**2 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA/CONTRAPARTIDA**

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR                 | %CONVÊNIO | % LDO |
|---------------|-----------------------|-----------|-------|
| Concedente    | R\$ 500.000,00        | 98,50     | -     |
| Parlamentar   | R\$ 0,00              | 0,00      | -     |
| Interveniente | R\$ 0,00              | 0,00      | -     |
| Contrapartida | R\$ 7.597,08          | 1,50      | 1,52  |
| Outras fontes | R\$ 0,00              | -         | -     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 507.597,08</b> |           |       |

NÚMERO DE REGISTRO DO SIGCON-SAÍDA: 5191000053/2016

DATA DO REGISTRO: 21/03/2016

**VII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS****CONCEDENTE**

| Mês   | Ano  | Valor          |
|-------|------|----------------|
| Março | 2016 | R\$ 350.000,00 |
| Julho | 2016 | R\$ 150.000,00 |

**CONVENENTE**

| Mês   | Ano  | Valor        |
|-------|------|--------------|
| Março | 2016 | R\$ 5.317,95 |
| Julho | 2016 | R\$ 2.279,13 |

**VIII - DECLARAÇÃO**

Na qualidade de representante legal do Convenente, declaro, para fins de prova junto ao Concedente, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Estado de Minas Gerais que impeça a transferência de recursos de dotações consignadas no orçamento estadual.

Local

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Assinatura do Representante Legal do Convenente

Carimbo de Identificação

**PARECER TÉCNICO**

Status do Parecer: Favorável

Atestamos que a Proposta de Plano de Trabalho apresentado pela Prefeitura Municipal de Natércia foi devidamente analisada por esta área técnica, sendo que os projetos de fls. 22 a 24 e os valores orçados na Planilha Orçamentária (Anexo II) fls. 30 e 31, de responsabilidade do engenheiro Ludmar Gonçalves de Sousa, CREA nº.49108/D, integrante do referido Plano, estão compatíveis com aqueles constantes da Tabela Referencial de Preços Unitários da SETOP para a região Sul, vigente a partir de Junho/2015 - Preço de custo com a Desoneração Fiscal - Lei 12.844/2013.

Objeto: Melhoramento de vias públicas com a execução de retirada e reassentamento de 2.104,38 m<sup>2</sup> de piso de concreto intertravado, retirada e reassentamento de 1.573,71 m<sup>2</sup> de bloquete, 7.479,85 m<sup>2</sup> de retirada e reassentamento de paralelepípedo, e 3.291,61 m de sarjeta.

O meio fio é existente em todas as Ruas, conforme relatório fotográfico em anexo fls. 34 a 49 e declaração em anexo fls. 50 a 52.

Forma de execução: Indireta.

Valor do convênio: R\$ 507.597,08.

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Análise Técnica

Carimbo de identificação

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Responsável pela Aprovação da Análise Técnica

Carimbo de identificação

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

**PARECER JURÍDICO**

Status do Parecer: Favorável

Cuida de análise da legalidade e compatibilidade do procedimento para a celebração de convênio entre a MGI e o Município de Natércia, com a interveniência desta Secretaria, com o objetivo de estabelecer cooperação técnica e financeira mútua para a realização das obras de melhoramento de vias públicas.

Instruem os presentes autos, dentre outros, os seguintes documentos: Instruem os presentes autos, dentre outros, os seguintes documentos: Proposta de Plano de Trabalho, regularidade do conveniente perante o CAGEC e CADIN, declaração de abertura de conta bancária específica, cálculo contrapartida mínima convênios de saída, declaração de contrapartida, Quadro de Detalhamento de Despesas -QDD, declaração de domínio público, declaração de meio-ambiente, Declaração de aplicação de valor a maior, projetos, memorial descritivo de serviços, memória de cálculo, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, relatório fotográfico, declaração de acessibilidade, declaração de remoção e reassentamento, declaração de drenagem superficial, declaração de infraestrutura, termo de compromisso, ART, plano de trabalho, Nota Técnica 95/2016, Declaração de disponibilidade de recursos-MGI, conforme documentos de fls. 02/67. Salienta-se que a presente análise toma por base exclusivamente os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Nos termos legais, a análise será realizada sob o prisma estritamente jurídico, não competindo examinar a conveniência e a oportunidade dos atos praticados no âmbito de atuação do gestor público, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa.(...)O cronograma de desembolso estabelece que a primeira transferência de recursos será efetivada em março e julho/2016. No entanto, diante do pleito eleitoral do corrente ano, faz-se necessário a observância das vedações impostas no art.73, inciso VI, alínea a, da Lei Federal nº 9.504, 30 de setembro de 1997, de realizar transferência voluntária de recursos aos Municípios, salvo nos casos, quando destinados a cumprir obrigação assumida em convênio com cronograma fixando previamente as datas dos repasses, assinado antes do dia 02/07/2016, para a execução de obra ou serviço cuja execução física já tenha se iniciado também antes do mesmo dia 02/07/2016; ou em situações de emergência ou calamidade pública, sem qualquer limitação de tempo. Salienta-se a obrigação da área técnica de complementar a instrução dos autos, quando da efetiva assinatura do convênio, com novo certificado demonstrando a manutenção da regularidade no CAGEC. Do exposto, entende-se possível a formalização do instrumento de convênio entre esta Secretaria e o Município de Natércia.

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Análise Jurídica

Carimbo de identificação

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Responsável pela Aprovação da Análise Jurídica

Carimbo de identificação

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

**CONVENIO**

NÚMERO DE REGISTRO DO SIGCON-SAÍDA: 5191000053/2016

DATA DO REGISTRO: 21/03/2016

**APROVAÇÃO**

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do convênio de saída.

\_\_\_\_\_  
Responsável pela aprovação do Plano de Trabalho

Carimbo de identificação

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_  
Responsável Legal do Concedente

Carimbo de identificação

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_


Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS


| PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |                 | FOLHA Nº: 01       |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------|
| OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS E BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO PARALELEPÍPEDO E BLOQUETE E EXECUÇÃO DE SARJETA DE 30 X 5 CM |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |                 | FORMA DE EXECUÇÃO: |                   |            |
| LOCAL: RUAS DIVERSAS CONFORME CROQUI                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |                 | ( ) DIRETA         | ( X )<br>INDIRETA | LDI: 23,99 |
| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO SUL JUNHO/2015 PREÇO DE CUSTO COM A DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |                 |                    |                   |            |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |                 |                    |                   |            |
| Item                                                                                                                                          | Código      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | unidade | Quantidade | P. Unit. s/ LDI | P. Unit. c/ LDI    | total             |            |
| 1.0                                                                                                                                           | IIO-001     | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |                 |                    |                   |            |
| 1.1                                                                                                                                           | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UN      | 1,00       | R\$ 1.159,26    | R\$ 1.437,37       | R\$ 1.437,37      |            |
| 2                                                                                                                                             | OBR-001     | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |                 |                    |                   |            |
|                                                                                                                                               |             | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS E BLOQUETES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                 |                    |                   |            |
| 2.1                                                                                                                                           |             | RETIRADA DOS BLOQUETES E REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO NAS ÁREAS : 2.104,38 m2 E 517,45 m2                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            | PREFEITURA      |                    |                   |            |
| 2.2                                                                                                                                           | OBR-VIA-217 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM                                                                                                                                                                                                                           | m2      | 2.104,38   | R\$ 70,74       | R\$ 87,71          | R\$ 184.576,28    |            |
| 2.3                                                                                                                                           | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM                                                                                                                                                                                                                                | m2      | 517,45     | R\$ 65,98       | R\$ 81,81          | R\$ 42.331,86     |            |



|                            |              |                                                                                                                               |    |          |           |           |                   |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------------------|
| 2.4                        | OBR VIA 206  | PARALELEPÍPEDO, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA                                                                | m2 | 7.479,85 | R\$ 22,88 | R\$ 28,37 | R\$ 212.195,21    |
| 2.5                        | OBR VIA 20   | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA                                                        | m2 | 1.056,26 | R\$ 20,88 | R\$ 25,89 | R\$ 27.345,63     |
| 3.0                        | DRE-SARJ     | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES                                                                                            |    |          |           |           |                   |
| 3.1                        | DRE-SARJ-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, i= 3% PADRÃO DEOP MG<br>Valor unitario da Sarjeta com 30 cm de largura (regra de tres) = R\$ 9,73 | M  | 3.291,61 | R\$ 9,73  | R\$ 12,06 | R\$ 39.710,73     |
| <b>VALOR TOTAL DA OBRA</b> |              |                                                                                                                               |    |          |           |           | <b>507.597,08</b> |

Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha: LUDMAR GONÇALVES DE SOUZA CAU OU CREA: 49108/D

Assinatura do Responsável Técnico: \_\_\_\_\_ Local e Data: \_\_\_\_\_





PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA


VALOR DO CONVÊNIO:  
507.597,08

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS E BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO PARALELEPÍPEDO E BLOQUETE E EXECUÇÃO DE SARJETA DE 30 X 5 CM

PRAZO DA OBRA: 90 DIAS

LOCAL: RUAS DIVERSAS CONFORME CROQUI


| ETAPAS                                                                                                                                                                                                                                                         | Físico/<br>Financeiro | Mes 1         | Mes 2         | Mes 3         | Total          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | Físico %              | 100%          |               |               | 100%           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Financeiro            | R\$ 1.437,37  |               |               | R\$ 1.437,37   |
| PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM                                                                                                 | Físico %              | 30%           | 50%           | 20%           | 100%           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Financeiro            | R\$ 55.372,88 | R\$ 92.288,14 | R\$ 36.915,26 | R\$ 184.576,28 |
| EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM                                                                                                      | Físico %              | 50%           | 50%           | 0%            | 100%           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Financeiro            | R\$ 21.165,93 | R\$ 21.165,93 |               | R\$ 42.331,86  |
| PARALELEPÍPEDO, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA                                                                                                                                                                                                 | Físico %              | 30%           | 30%           | 40%           | 100%           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Financeiro            | R\$ 63.658,56 | R\$ 63.658,56 | R\$ 84.878,08 | R\$ 212.195,21 |
| CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA                                                                                                                                                                                         | Físico %              |               | 50%           | 50%           | 100%           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Financeiro            |               | R\$ 13.672,82 | R\$ 13.672,82 | R\$ 27.345,63  |



|                                                                           |            |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, i= 3% PADRÃO DEOP M(                          | Físico %   | 50%            | 30%            | 20%            | 100%           |
|                                                                           | Financeiro | R\$ 19.855,37  | R\$ 11.913,22  | R\$ 7.942,15   | R\$ 39.710,73  |
| Valor unitario da Sarjeta com 30 cm de largura (regra de tres) = R\$ 9,73 | Físico %   |                |                |                |                |
|                                                                           | Financeiro |                |                |                |                |
| TOTAL                                                                     | Físico %   | 31,81%         | 39,93%         | 28,26%         | 100%           |
|                                                                           | Financeiro | R\$ 161.490,11 | R\$ 202.698,67 | R\$ 143.408,30 | R\$ 507.597,08 |

Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha: LUDMAR GONÇALVES DE SOUZA CAU OU CREA: 49108/D

Assinatura do Responsável Técnico: \_\_\_\_\_ Local e Data: \_\_\_\_\_





## MEMORIA DE CALCULO

### PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS E BLOQUETES: (novos)

#### Rua Cristiano Caetano – Centro - (INTERTRAVADOS)

Área = 1.007,09 m<sup>2</sup> - Retirado do Auto CAD

#### Rua Benedito Bueno dos Santos – Centro - (INTERTRAVADOS)

Área = 520,14 m<sup>2</sup> - Retirado do Auto CAD

#### Rua São Pedro – Centro (Parte) - (INTERTRAVADOS)

Área = 577,15 m<sup>2</sup> - Retirado do Auto CAD

**Total de Pavimentação Intertravados:  $1.007,09 + 520,14 + 577,15 = 2.104,38$  m<sup>2</sup>**

#### Rua Antonio Alves da Silva – Centro (Parte) (BLOQUETES)

Área = 517,45 m<sup>2</sup> - Retirado do Auto CAD

**Total de Pavimentação Bloquetes: 517,45 m<sup>2</sup>**

### RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO

#### Rua São Pedro – Centro (Parte)

Área = 2.030,98 m<sup>2</sup> - Retirado do Auto CAD

#### Rua Prefeito Jose Goulart Junho – Centro

Área = 249,48 m<sup>2</sup> - Retirado do Auto CAD

#### Rua Joaquim Torquato – Centro

Área = 443,29 m<sup>2</sup> - Retirado do Auto CAD

#### Rua João Lisboa Carneiro – Centro

Área = 1.073,85 m<sup>2</sup> - Retirado do Auto CAD

#### Rua Coronel Paiva – Centro

Área = 1.294,65 m<sup>2</sup> - Retirado do Auto CAD

#### Rua Jose de Souza Campos – Centro

Área = 2.387,60 m<sup>2</sup> - Retirado do Auto CAD

**Total de Retirada e Reassentamento Paralelepípedo:  $2.030,98 + 249,48 + 443,29 + 1.073,85 + 1.294,65 + 2.387,60 = 7.479,85 \text{ m}^2$**



## **RETIRADA E REASSENTAMENTO DE BLOQUETE**

**Rua Minervina de Farias Souza – São João**

**Área =  $1.056,26 \text{ m}^2$  - Retirado do Auto CAD**

### **SARJETAS**

**Rua Antonio Alves da Silva - Centro**

**Sarjeta: Lado Direito  $28,47 + 57,83$  + lado Esquerdo  $96,17 = 182,47 \text{ M}$ .**

**Rua Cristiano Caetano - Centro**

**Sarjeta: Lado Direito  $3,87 + 167,01$  + Lado Esquerdo  $3,87 + 9,22 + 153,73$   
( $3,87 + 167,01 + 9,22 + 3,87 + 153,73$ ) =  **$337,70 \text{ M}$****

**Rua Benedito Bueno dos Santos - Centro**

**Sarjeta: Lado Direito  $22,76 + 29,71 + 16,19$  + Lado Esquerdo  $83,10$   
( $22,76 + 29,71 + 16,19 + 83,10$ ) =  **$151,76 \text{ M}$****

**Rua São Pedro – Centro (Parte da área de Intertravado)**

**Sarjeta: Lado Direito  $98,15$  + Lado Esquerdo  $95,17 = 193,32 \text{ M}$**

**Rua São Pedro – Centro (Parte da área de Paralelepípedo)**

**Sarjeta: Lado Direito  $13,79 + 137,53 + 69,44 + 5,22$  + Lado Esquerdo  $88,83 + 159,63$   
( $13,79 + 137,53 + 69,44 + 5,22 + 88,83 + 159,63$ ) =  **$474,44 \text{ M}$****

**Rua Prefeito Jose Goulart Junho – Centro**

**Sarjeta: Lado Direito  $33,71$  + Lado Esquerdo  $34,57 = 68,28 \text{ M}$**

**Rua Joaquim Torquato – Centro**

**Sarjeta: Lado Direito  $41,59 + 35,64$  + Lado Esquerdo  $88,99$  ( $41,59 + 35,64 + 88,99$ ) =  **$166,22 \text{ M}$****

**Rua João Lisboa Carneiro – Centro**


**Sarjeta: Lado Direito  $197,57$  + Lado Esquerdo  $183,16 = 380,73 \text{ M}$**

**Rua Coronel Paiva – Centro**

**Sarjeta: Lado Direito  $169,65$  + Lado Esquerdo  $179,67 = 349,32 \text{ M}$**

**Rua Jose de Souza Campos – Centro**

Sarjeta: Lado Direito 37,87+130,52+72,77 +31,93 + 36,56 + Lado Esquerdo 63,34 + 214,95 + 52,13 (37,87+130,52+72,77+31,93+36,56+63,34+214,95+52,13) = **640,07 M**



**Rua Minervina de Farias Souza – São João**

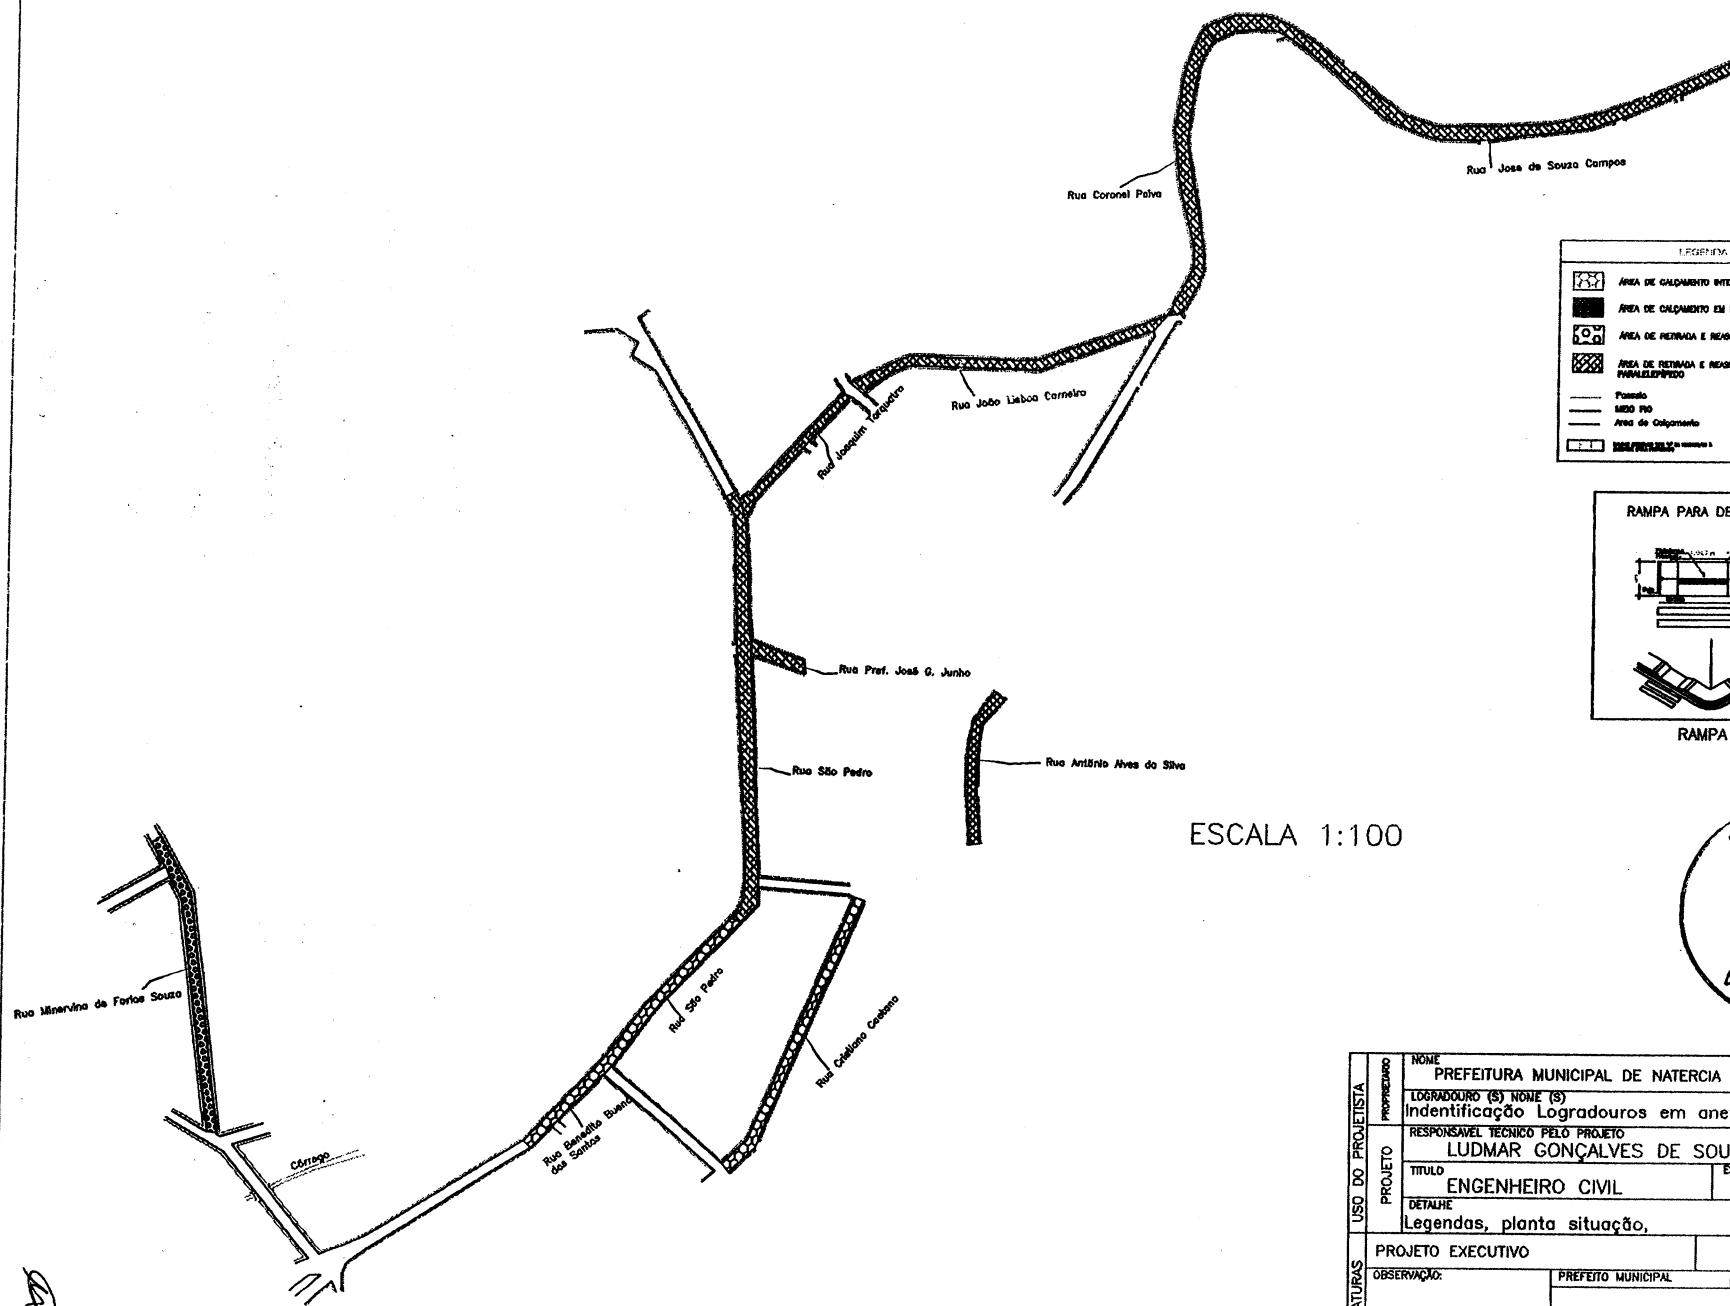
Sarjeta: Lado Direito 178,91+ Lado Esquerdo 152,21+ 16,61(178,91+151,79+16,60)= **347,30 M**

**Total da Sarjeta: 182,47 + 337,70 + 151,76 + 193,32 + 474,44 + 68,28 + 166,22 + 380,73+349,32 + 640,07 + 347,30= 3.291,61 M.**

Natercia 07/03/2016


ART : 2847291

\_\_\_\_\_  
LUDMAR GONÇALVES DE SOUSA  
CREA MG 49108/D




LEGENDA

|  |                                                      |
|--|------------------------------------------------------|
|  | ÁREA DE CALÇAMENTO INTERTRAVADO                      |
|  | ÁREA DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE                       |
|  | ÁREA DE RETIRADA E REABASTECIMENTO EM BLOQUETE       |
|  | ÁREA DE RETIRADA E REABASTECIMENTO EM PARALELEPÍPEDO |
|  | Pavimento                                            |
|  | MED. 150                                             |
|  | Área de Calçamento                                   |
|  | RESERVAÇÃO                                           |



RAMPA PARA DEFICIENTE

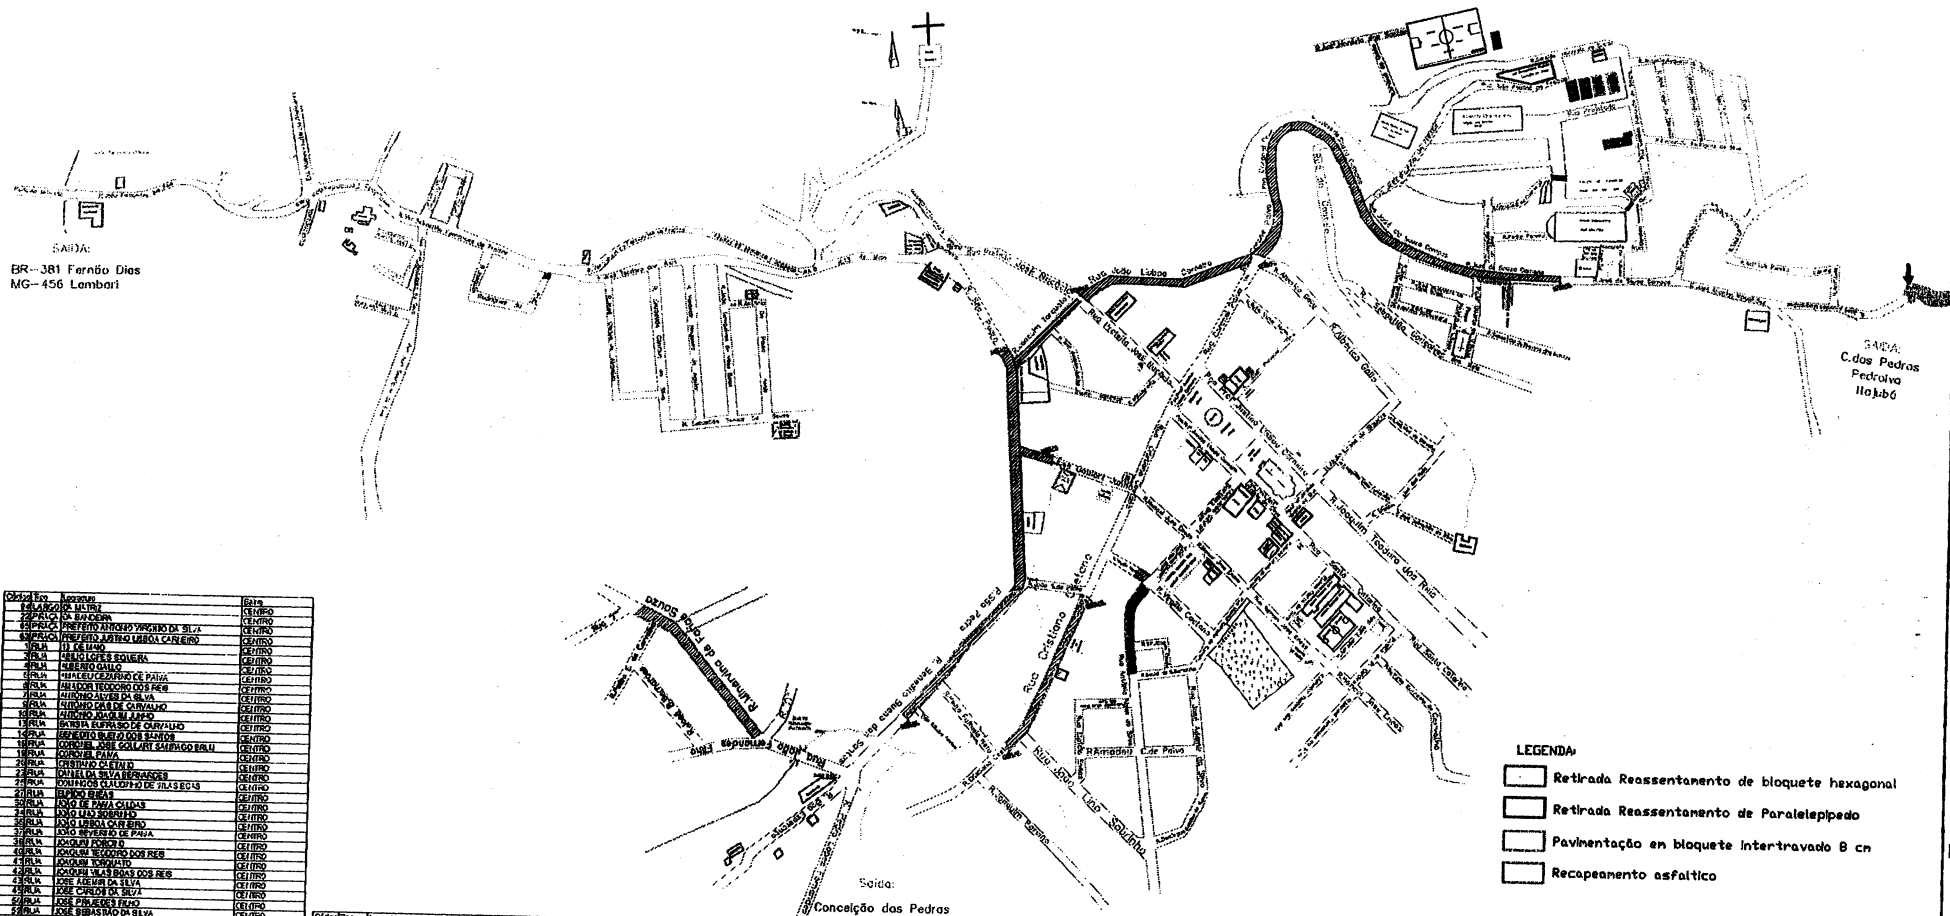
ESCALA 1:100



|                |                                  |                                     |  |                                                |           |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------------------|-----------|
| USO DO PROJETO | NOME                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA    |  | MUNICÍPIO                                      | NATERCIA  |
|                | LOGRADOURO (S) NOME (S)          | Indentificação Logradouros em anexa |  | BAIRRO                                         | DIVERSOS  |
|                | RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO | LUDMAR GONÇALVES DE SOUSA           |  | CREA                                           | 49108 / D |
|                | TÍTULO                           | ENGENHEIRO CIVIL                    |  | ESCALA                                         | DATA      |
|                | DETALHE                          | Legendas, planta situação,          |  | FOLHA                                          | 01/01     |
| ASSINATURAS    | PROJETO EXECUTIVO                |                                     |  |                                                |           |
|                | OBSERVAÇÃO:                      | PREFEITO MUNICIPAL                  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO                            |           |
|                |                                  | CRISTIANO ANTONIO CAETANO JUNHO     |  | LUDMAR GONÇALVES DE SOUSA<br>CREA MG 49108 / D |           |

# MAPA DO PERÍMETRO URBANO DE NATÉRCIA

ADM:2013/2016



SABIA:  
BR-381 Fernão Dias  
MG-456 Lombardi

SABIA:  
C. das Pedras  
Pedrova  
Ilajobô


| Código | Logradouro         | Barro  |
|--------|--------------------|--------|
| 0101   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0102   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0103   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0104   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0105   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0106   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0107   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0108   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0109   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0110   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0111   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0112   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0113   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0114   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0115   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0116   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0117   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0118   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0119   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0120   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0121   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0122   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0123   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0124   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0125   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0126   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0127   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0128   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0129   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0130   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0131   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0132   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0133   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0134   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0135   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0136   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0137   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0138   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0139   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0140   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0141   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0142   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0143   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0144   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0145   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0146   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0147   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0148   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0149   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0150   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0151   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0152   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0153   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0154   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0155   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0156   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0157   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0158   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0159   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0160   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0161   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0162   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0163   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0164   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0165   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0166   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0167   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0168   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0169   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0170   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0171   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0172   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0173   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0174   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0175   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0176   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0177   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0178   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0179   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0180   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0181   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0182   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0183   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0184   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0185   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0186   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0187   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0188   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0189   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0190   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0191   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0192   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0193   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0194   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0195   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0196   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0197   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0198   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0199   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0200   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |

| Código | Logradouro         | Barro  |
|--------|--------------------|--------|
| 0201   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0202   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0203   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0204   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0205   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0206   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0207   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0208   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0209   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0210   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0211   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0212   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0213   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0214   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0215   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0216   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0217   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0218   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0219   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0220   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0221   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0222   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0223   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0224   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0225   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0226   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0227   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0228   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0229   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0230   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0231   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0232   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0233   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0234   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0235   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0236   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0237   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0238   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0239   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0240   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0241   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0242   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0243   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0244   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0245   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0246   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0247   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0248   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0249   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |
| 0250   | AV. ALVARO DE LIMA | CEIMBO |

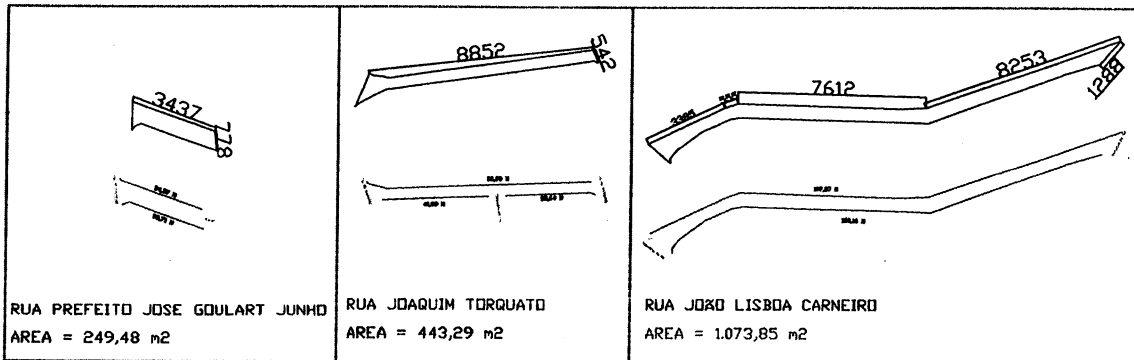
## LEGENDA:

- Retirada Reassentamento de bloquete hexagonal
- Retirada Reassentamento de Paralelepípedo
- Pavimentação em bloquete intertravado 8 cm
- Recapamento asfáltico

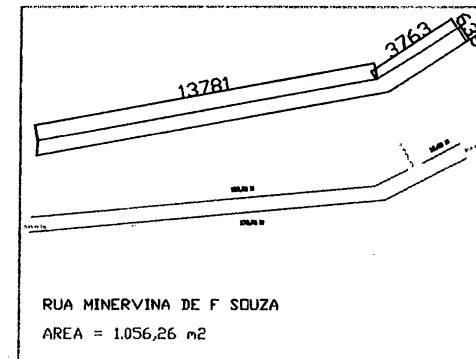
|                                  |                                         |  |                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--|---------------------------|
| PROPRIETÁRIO                     | NOME                                    |  | MUNICÍPIO                 |
|                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA        |  | NATÉRCIA                  |
| PROJETO                          | LOGRADOURO (S) NOME (S)                 |  | BAIRRO                    |
|                                  | Identificação Logradouros em anexo      |  | DIVERSOS                  |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO | LUDMAR GONÇALVES DE SOUSA               |  | CREA                      |
|                                  |                                         |  | 49108 / D                 |
| TÍTULO                           | ENGENHEIRO CIVIL                        |  | ESCALA                    |
|                                  |                                         |  | DATA                      |
| DETALHE                          | planta de situação - georeferenciamento |  | FOLHA                     |
|                                  |                                         |  | 01/01                     |
| ASSINATURAS                      | PROJETO EXECUTIVO                       |  |                           |
|                                  | OBSERVAÇÃO:                             |  |                           |
|                                  | PREFEITO MUNICIPAL                      |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO       |
|                                  | CRISTIANO ANTONIO CAETANO JUNHO         |  | LUDMAR GONÇALVES DE SOUSA |
|                                  |                                         |  | CREA MG 49108 / D         |



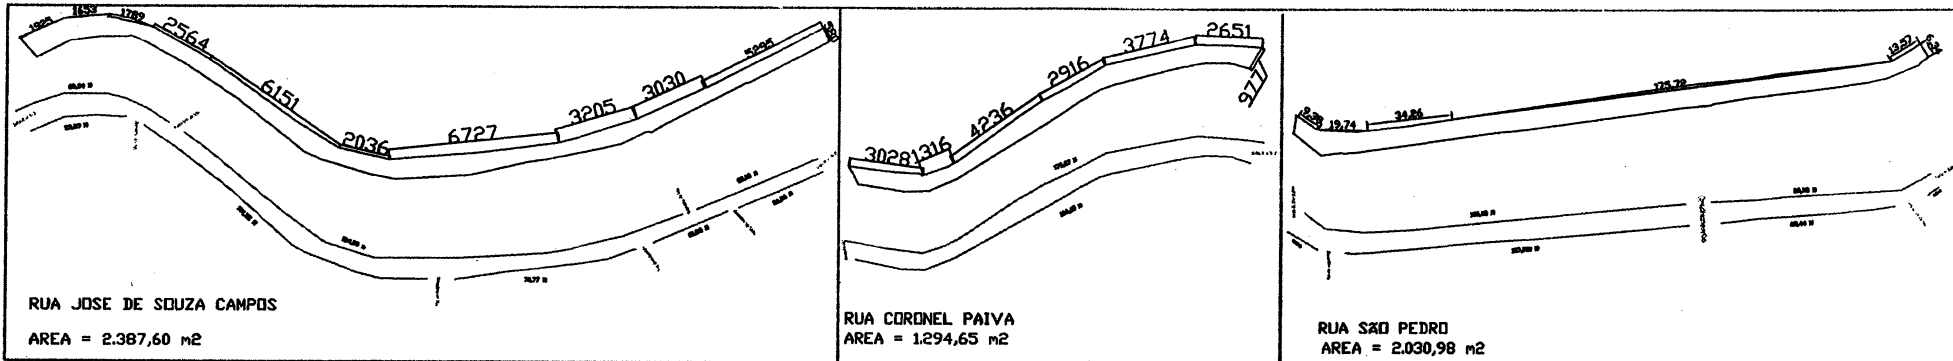
# RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO



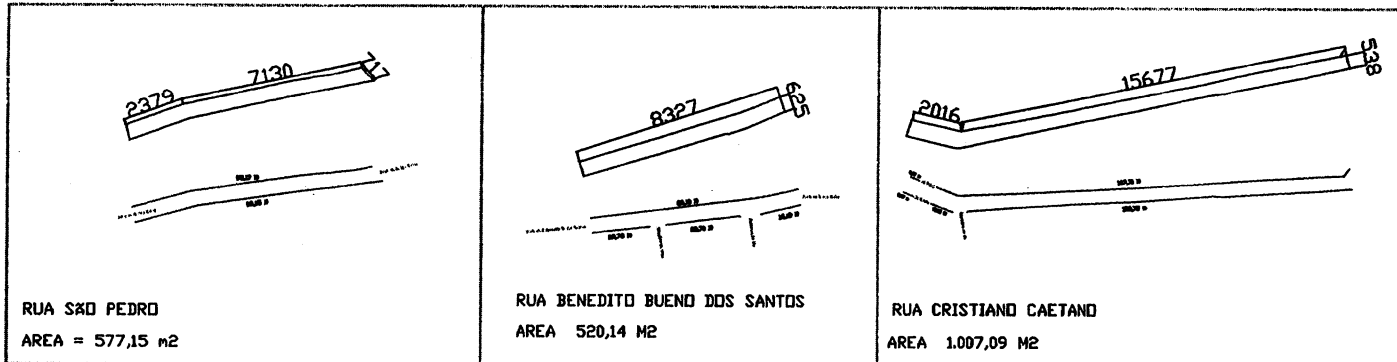
# RETIRADA E REASSENTAMENTO DE BLOQUETE HEXAGONAL



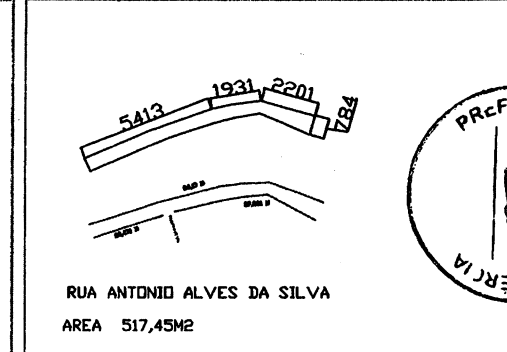
# RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO



# PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO 8 CM



# PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE 8 CM



# NOTAS:


- Areas de Ruas Inclusive
- Sarjetas de 30 cm de cada lado
- Areas consideradas as medidas de largura de cada rua

LEGENDA:

- Retirada Reassentamento de Bloquete hexagonal
- Retirada Reassentamento de Paralelepipedo
- Pavimentação em bloquete intertravado 8 cm
- Pavimentação em bloquete 8 cm
- Linha de Sarjeta



| USO DO PROJETO                 | PROJETO                        | PROJETO EXECUTIVO              |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| PROJETO MUNICIPAL              | PROJETO MUNICIPAL              | PROJETO MUNICIPAL              |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO            | RESPONSÁVEL TÉCNICO            | RESPONSÁVEL TÉCNICO            |
| CRISTIANO ALVES CAETANO JUNIOR | CRISTIANO ALVES CAETANO JUNIOR | CRISTIANO ALVES CAETANO JUNIOR |
| LUDMAR GONÇALVES DE SOUSA      | LUDMAR GONÇALVES DE SOUSA      | LUDMAR GONÇALVES DE SOUSA      |
| 01/01                          | 01/01                          | 01/01                          |



## ADHOBE CONSTRUTORA EIRELI – EPP

Rua Ariosto Buller Souto, 33, conj. 04 e 05, CEP: 11.672-130  
Pontal de Santa Marina - Caraguatatuba/SP  
CNPJ: 13.293.713/0001-32  
adhobeconstrutor@hotmail.com

### Proposta



À Prefeitura Municipal de Natércia

REFERÊNCIA: PROCESSO LICITATÓRIO DE N.º 050/2016

TOMADA DE PREÇO N.º 002/2016

**OBJETO:** Constitui o objeto da presente licitação a **Contratação de Empresa Para Pavimentação em locos Intertravados e Bloquete, Retirada e Reassentamento Paralelepípedo e Bloquete e Execução de Sarjeta de 30 X 5 CM no Município de Natércia – MG**

Nome da Licitante: **ADHOBE CONSTRUTORA EIRELI – EPP**

Número do CNPJ: 13.293.713/0001-32

Número da Inscrição Estadual: 254.087.978.119

Endereço Completo: R. Ariosto Buller Souto, 33, conj. 04 e 05, Pontal de Santa Marina  
Caraguatatuba/SP, CEP: 11.672-130.

Telefone e Fax: 12-99603.1514 / E-mail: adhobeconstrutor@hotmail.com

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços da licitação em referência, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação.

O valor da prestação dos serviços será de **R\$ 370.337,83 (Trezentos e setenta mil trezentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos)** conforme composição dos custos de acordo com a planilha.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de execução dos serviços: 3 (três) meses

Condições de pagamento: 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal e medição aprovada pela contratante.


Informamos os dados da conta bancária da empresa para futuros pagamentos, no caso de contratação:

Banco: 341 (ITAU S/A)


Agência: 0248


Conta: 00547-2

REPRESENTANTE LEGAL: GESUILSON MIRANDA NUNES

  
\_\_\_\_\_  
Gesuilson Miranda Nunes  
Titular

Caraguatatuba, 03 de maio de 2016




**ADHOBE CONSTRUTORA EIRELI - EPP**  
Rua: Ariosto Buller Souto, 33 - Pontal Santa Marina Caraguatatuba/SP  
CNPJ: 13.293.713/0001-32  
adhobeconstrutor@hotmail.com


### COMPOSIÇÃO DO BDI

PREFEITURA: Municipal de Natércia

| COMPOSIÇÃO DO BDI     | %      |
|-----------------------|--------|
| Riscos e Seguros      | 0,90%  |
| Administração central | 1,69%  |
| Despesas financeiras  | 1,53%  |
| Pis/ Cofins           | 3,76%  |
| IRPJ e CSLL           | 6,68%  |
| ISS                   | 3,65%  |
| Lucro                 | 5,88%  |
| BDI:                  | 23,99% |

Assinatura do responsável técnico:  
CAU/SP: A61694-0



**ADHOBE CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Rua: Ariosto Buller Souto, 33 - Pontal Santa Marina Caraguatatuba/SP

CNPJ: 13.293.713/0001-32

adhobeconstrutor@hotmail.com

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| PREFEITURA: Municipal de Natércia                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 370.337,83    |                 | DATA: 03/05/2016 |                         |               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|---------------|
| OBRA: Pavimentação em blocos intertravados e bloquetes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LOCAL: RUAS DIVERSAS CONFORME CROQUI |                 |                  | PRAZO DA OBRA: 03 meses |               |
| ITEM                                                   | ETAPAS/DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FÍSICO/<br>FINANCEIRO                | TOTAL<br>ETAPAS | MÊS 1            | MÊS 2                   | MÊS 3         |
| 1                                                      | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,28 AFIXADAS COM REBITES 640 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" EBRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NA FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS | Físico %                             | 0,39%           | 100,00%          |                         |               |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Financeiro                           | R\$ 1.437,37    | R\$ 1.437,37     |                         |               |
| 2                                                      | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8CM - FCK=35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASENTAMENTO E=6CM                                                                                                                                                                                                                                           | Físico %                             | 35,23%          | 30,00%           | 50,00%                  | 20,00%        |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Financeiro                           | R\$ 130.471,56  | R\$ 39.141,47    | R\$ 65.235,78           | R\$ 26.094,31 |
| 3                                                      | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E= 8CM - FCK= 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASENTAMENTO E = 6CM                                                                                                                                                                                                                                              | Físico %                             | 7,96%           | 50,00%           | 50,00%                  |               |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Financeiro                           | R\$ 29.494,65   | R\$ 14.747,33    | R\$ 14.747,33           |               |
| 4                                                      | PARALELEPÍPEDO, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Físico %                             | 40,09%          | 30,00%           | 30,00%                  | 40,00%        |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Financeiro                           | R\$ 148.475,02  | R\$ 44.542,51    | R\$ 44.542,51           | R\$ 59.390,01 |



|       |                                                                        |            |                |               |               |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 5     | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | Físico %   | 7,38%          |               | 50,00%        | 50,00%        |
|       |                                                                        | Financeiro | R\$ 27.345,63  |               | R\$ 13.672,82 | R\$ 13.672,82 |
| 6     | SARJETA TIPO 1 - 50X50CM,i= 3% PADRÃO DEOP MG                          | Físico %   | 8,94%          | 50,00%        | 30,00%        | 20,00%        |
|       |                                                                        | Financeiro | R\$ 33.113,60  | R\$ 16.556,80 | R\$ 9.934,08  | R\$ 6.622,72  |
|       |                                                                        | Físico %   |                |               |               |               |
|       |                                                                        | Financeiro |                |               |               |               |
| TOTAL |                                                                        | Físico %   | 100,00%        | 31,44%        | 40,00%        | 28,56%        |
|       |                                                                        | Financeiro | R\$ 370.337,83 | 116.426,48    | 148.132,62    | 106.779,86    |

Assinatura do responsável técnico: \_\_\_\_\_


CAU/SP: A61694-0

Observações: LDI 23,99%

Assinatura do responsável técnico: \_\_\_\_\_  
CAU/SP: A61694-0

Observações: LDI 23,99%





ADHOBE CONSTRUTORA EIRELI – EPP  
Rua: Ariosto Buller Souto, 33 – Pontal Santa Marina Caraguatatuba/SP  
CNPJ: 13.293.713/0001-32

### PLANILHA DE ORÇAMENTO


Prefeitura Município de Natércia / MG

REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 050/2016 TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016

Projeto: Pavimentação em blocos intertravados e bloquetes

Responsável Técnico: Arq e Urbanista Gesuilson Miranda Nunes /CAU: a616940

|      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |                        | FORMA DE EXECUÇÃO:     |                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------|------------------------|----------------------|
|      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |                        | ( ) DIRETA             | (X) INDIRETA         |
|      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |                        |                        | BDI 23,99%           |
| Item | Código                                                                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | QUANT. | Unid. | Preço unitário SEM BDI | Preço unitário COM BDI | Valor previsto total |
| 1.0  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |                        |                        |                      |
| 1.1  | IIO-PLA-005                                                                      | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" EBRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS | 1,00   | unid. | R\$ 1.159,26           | 1.437,37               | 1.437,37             |
| 2.0  | OBRAS VIARIAS ( PAVIMENTAÇÃO DE RUAS) - PAV. EM BLOCOS INTERTRAVADOS E BLOQUETES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |                        |                        | SUBTOTAL 1.437,37    |
| 2.1  |                                                                                  | RETIRADA DOS BLOQUETES E REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIARIO NAS AREAS: 2.104,38m² E 517,45m²                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |                        |                        |                      |



|     |                                    |                                                                                                                                                        |          |    |           |          |            |
|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|----------|------------|
| 2.2 | OBR-VIA-217                        | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8CM - FCK=35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRASPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E=6CM | 2104,38  | m² | R\$ 47,13 | 62,00    | 130.471,56 |
| 2.3 | OBR-VIA-215                        | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E= 8CM - FCK= 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRASPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHAO DE ASSENTAMENTO E = 6CM    | 517,45   | m² | R\$ 43,33 | 57,00    | 29.494,65  |
| 2.4 | OBR-VIA-206                        | PARALELEPÍPEDO, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA                                                                                         | 7479,85  | m² | R\$ 15,09 | 19,85    | 148.475,02 |
| 2.5 | OBR-VIA-20                         | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA                                                                                 | 1056,26  | m² | R\$ 20,88 | 25,89    | 27.345,63  |
| 3.0 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |                                                                                                                                                        |          |    |           | SUBTOTAL | 335.786,87 |
| 3.1 | DRE-SARJ-005                       | SARJETA TIPO 1 - 50X50CM, I= 3% PADRÃO DEOP MG ( VALOR UNITARIO DA SARJETA COM 630CM DE LARGURA "REGRA DE TRES" = 9,73)                                | 3.291,61 | m  | R\$ 7,65  | 10,06    | 33.113,60  |
|     |                                    |                                                                                                                                                        |          |    |           | SUBTOTAL | 33.113,60  |
|     |                                    |                                                                                                                                                        |          |    |           | TOTAL    | 370.337,83 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA**  
Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, 100 – Centro - Natércia/MG  
CNPJ: 17.935.412/0001-16 - Tel/Fax. (35) 3456-1238 – Cep: 37524-000

CONFERE COM O ORIGINAL  
Natércia-MG 30/06/2016  
Daniele Mayra da Cruz  
Gestora Municipal de Convênios  
CPF 087.804.186-94

**TERMO DE CONTRATO Nº 024/2016**

**Contrato Para Pavimentação em Blocos Intertravados e Bloquete, Retirada e Reassentamento Paralelepípedo e Bloquete e Execução de Sarjeta de 30 X 5 Cm no Município de Natércia - MG.**

**REF. Tomada de Preço 002/2016  
PRC 050/2016**

Por este instrumento, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA (MG)**, com sede administrativa à Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, nº 100, inscrita no CNPJ MF sob o nº 17.935.412/0001-16, neste ato representado pelo Seu Prefeito, o Senhor Cristiano Antônio Caetano Junho, doravante chamado apenas MUNICIPIO, e de outra parte a Empresa Adhobe Construtora Eireli - EPP, inscrita no CNPJ Nº 13.293.713/0001-32 e Inscrição Estadual 254.087.978-119, sediada à Rua Ariosto Buller Souto, nº 33, Conjunto 04 e 05, Pontal de Santa Marina em Caraguatatuba - SP, por seu representante o Senhor Lucien Khoury, inscrito no CPF sob o nº 108.317.618-81 e RG nº 12.996.820, neste ato chamado apenas CONTRATADO, têm entre si como justo e acertado o presente Contrato para **Contratação de Empresa Para Pavimentação em Blocos Intertravados e Bloquete, Retirada e Reassentamento Paralelepípedo e Bloquete e Execução de Sarjeta de 30 X 5 CM no Município de Natércia - MG**, em conformidade com o Processo Licitatório nº 050/2016, Tomada de Preço nº. 002/2016 e seus Anexos, sob a regência da Lei Federal 8.666/93, e alterações posteriores, e que se regerá pelas seguintes condições:

**1.0 DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS**

1.1 A CONTRATADA se obriga perante o MUNICIPIO a executar a Obra de **Pavimentação em Blocos Intertravados e Bloquete, Retirada e Reassentamento Paralelepípedo e Bloquete e Execução de Sarjeta de 30 X 5 CM no Município de Natércia - MG**, com as características e quantidades indicadas no ANEXO I do Edital da Tomada de Preço nº 002/2016, juntamente com as especificações técnicas e projetos e conforme Quadro Resumo das Propostas a que correspondem este pacto.

1.2 A Execução dos serviços relacionados no ANEXO I e conforme especificações técnicas e projetos serão feitos diretamente nas **diversas Ruas do Município de Natércia - MG Conforme Memória de Cálculo** pela CONTRATADA, mediante requisição/autorização emitida pela Administração, devidamente autorizada por autoridade superior.

1.3 A CONTRATADA obriga-se a manter a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar o MUNICIPIO, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.

1.4 A Firma contratada para a execução dos serviços, objeto do presente instrumento, obrigar - se, ainda, á:

1.4.1 Executar os serviços licitados na quantidade solicitada pelo Município, através de requisição, até a quantidade total licitada;

1.4.2 Fornecer á Licitadora as competentes notas fiscais referentes aos serviços efetuados, em conformidade com a solicitação do Município, especificações técnicas e projetos;

1.4.3 Utilizar exclusivamente produtos e serviços de boa qualidade e que atendam as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, existentes e aplicáveis quanto ao fornecimento do objeto desta licitação para o correto atendimento às necessidades da Administração;

1.4.4 Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas com pessoas envolvidas na execução do fornecimento, que não terão vínculo empregatício com a licitadora;

1.4.5 Assumir a total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham causar ao patrimônio da licitadora ou a terceiros, quando da execução do fornecimento, objeto deste instrumento;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA**  
**Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, 100 – Centro - Natércia/MG**  
**CNPJ: 17.935.412/0001-16 - Tel/Fax. (35) 3456-1238 – Cep: 37524-000**

CONFERE COM O ORIGINAL  
Natércia-MG 20/06/16  
Daniele Mayra Cruz  
Gestora Municipal de Convênios  
CPF 087.804.186-94

1.4.6

§ 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93. Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões até o limite fixado no

## 2.0

### DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1

Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da execução do objeto da presente licitação, bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os Seus Anexos, os seguintes documentos:

- a- Tomada de Preço nº 002/2016 e seus anexos com especificações técnicas e projetos.
- b- Proposta da CONTRATADA, e
- c- Quadro Resumo das Propostas.

2.2

Os Documentos referidos no presente item, são considerados suficientes para, em complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.

## 3.0

### DA VIGÊNCIA

3.1

O presente Contrato vigorará de 23 de maio de 2016 até 20 de agosto de 2016, totalizando o prazo de 90 dias (noventa) dias, contados da data de firmamento do presente ajuste e de acordo com o cronograma de execução e proposta apresentados pela CONTRATADA, podendo ser renovado em conformidade com a Lei 8.666/93.

## 4.0

### DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1

O objeto contratual será recebido provisoriamente pelo técnico responsável por seu acompanhamento e fiscalização que for designado pelo MUNICIPIO para tanto, mediante termo assinado pelas partes, dentro de 15 (QUINZE) dias contados da data de comunicação escrita de seu termino para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços e produtos com as especificações e consequente aceitação e rejeição.

4.2

Durante o período de 30 (Trinta) dias da data de expedição do termo supra, a obra ficará sob observação, de molde a se verificar o cumprimento das exigências construtivas.

4.3

Esgotado o prazo previsto na Clausula Anterior e uma vez restando comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, a obra será recebida definitivamente, por servidor ou comissão designada pelo MUNICIPIO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

4.4

O MUNICIPIO reserva-se o direito não receber os serviços e produtos em desacordo com o previsto neste instrumento, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93.

## 5.0

### GARANTIAS TÉCNICAS E REPARAÇÕES

5.1

Após recebimento definitivo do objeto contratual, por parte do MUNICIPIO, a empresa CONTRATADA ficará, ainda, responsável pelo prazo de 3 (três) anos, contados da data de firmamento do Termo de Recebimento Definitivo, por quaisquer defeitos, ainda que resultantes dos materiais empregados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, obrigando-se às suas expensas, às reparações e/ou substituições que se fizerem necessárias para o perfeito cumprimento do Contrato.

5.2

Se a CONTRATADA não executar os reparos e/ou substituições, nos prazos que lhe forem determinados pelo MUNICIPIO, este, se assim lhe convier, poderá mandar executá-los por conta e risco daquela, por outras empresas, cobrando-lhes os respectivos custos.

## 6.0

### GARANTIAS DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, 100 - CNPJ: 17.935.412/0001-16 - Natércia - MG  
TELEFAX: (35) 3456-1238 - CEP: 37524-000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA**  
**Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, 100 – Centro - Natércia/MG**  
**CNPJ: 17.935.412/0001-16 - Tel/Fax. (35) 3456-1238 – Cep: 37524-000**

CONFERE COM O ORIGINAL  
Natércia-MG 30/06/16

**Danielle Mayra da Cruz**  
Gestora Municipal de Convênios  
CPF 087.804.186-94

6.1 As Garantias prestadas pela CONTRATADA no ato da assinatura deste Contrato, como elemento assecuratório do cumprimento das obrigações contratuais, será devolvida logo após a plena, perfeita e correta execução do convencionado.

## 7.0 PENALIDADES

7.1 Ocorrendo atraso injustificado na execução do contrato, tendo por base o Cronograma Físico que é parte integrante da Tomada de Preço 002/2016 e deste, importará na aplicação à CONTRATADA de multa diária na ordem de 0.3% (três décimos por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor dos serviços não Realizados.

7.2 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto, não executado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o consequente cancelamento da nota de empenho, contrato ou documento correspondente.

7.3 O recolhimento das multas retro referidas deverá ser feito, através de guia própria, ao MUNICIPIO de NATÉRCIA (MG), no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que foi aplicada.

7.4 A execução do(s) serviço(s) fora das características originais, também ocasionará a incidência de multa prevista em 7.1, pois nessa situação a desconformidade de especificações equivalerá ao não fornecimento ou execução.

7.5 À CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 7.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste.

7.6 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.

7.7 A inexecução total do Contrato, importará a CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta no Município de NATÉRCIA (MG), pelo prazo desde já fixado de 24 meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor do contrato.

7.8 Será propiciada Ampla Defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos itens precedentes.

7.9 Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos que a CONTRATADA tiver direito, ou cobrado judicialmente.

7.10 Na eventualidade de ocorrer atraso no pagamento, o valor será atualizado pela variação acumulada do INPC, ou outro valor que o substitua, ocorrida entre a data de sua exigibilidade e a do referido pagamento, calculada *pro rata tempore*.

7.11 Para a hipótese definida em 7.9, a CONTRATADA fica obrigada a emitir fatura suplementar, identificando de forma clara de que se trata de valor pertinente à atualização financeira originária de pagamento de fatura em atraso por inadimplemento do MUNICIPIO.

## 8.0 DO PREÇO, MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 Os Pagamentos pela execução dos serviços, objeto decorrentes da presente Licitação, serão efetuados, Pela Prefeitura Municipal de NATÉRCIA (MG), por processo legal, observada a Proposta Comercial apresentada até o 30º (trigésimo) dia corrido após liberação do repasse feito pelo governo para cada medição da obra mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA, desde que obedecidas às formalidades contratuais e legais pertinentes, em consonância com o acompanhamento dos serviços efetuados pelo Departamento competente e o devido **Certificado de Medição**, e depois de atestado pelo órgão competente o cumprimento das obrigações devidas por parte da Contratada.

8.2 O preço total para a execução da Obra, objeto deste Contrato, são os apresentados na proposta da CONTRATADA e conforme apurado no Quadro Resumo das Propostas, devidamente aprovada pelo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA**  
**Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, 100 – Centro - Natércia/MG**  
**CNPJ: 17.935.412/0001-16 - Tel/Fax. (35) 3456-1238 – Cep: 37524-000**

CONFERE COM O ORIGINAL  
Natércia-MG 30/06/16  
Daniele Mayra da Cruz  
Gestora Municipal de Convênios  
CPF 087.804.186-94

MUNICIPIO, o qual totaliza o valor de R\$ 370.337,83 (trezentos e setenta mil e trezentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos).

8.3 Os Preços unitário e Global retro referidos, são finais, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.

8.4 Os preços dos serviços a serem executados deverão ser estipulados, de forma unitária, em moeda oficial, já incluído os tributos, fretes e seguros e demais encargos. Os preços apresentados não poderão ser além do preço de mercado.

8.5 A cada 15 dias de fluência do prazo de execução, o MUNICIPIO através de agentes fiscalizadores, realizará medição dos trabalhos executados, emitindo o correspondente Certificado de Medição.

8.6 Os valores dos itens de serviços executados e medidos serão calculados multiplicando-se as quantidades medidas pelos respectivos preços unitários.

8.7 O valor de cada medição será obtido pelo somatório dos valores dos itens de serviços medidos no período de referencia.

8.8 Com base nos Certificados de Medição emitidos pela fiscalização, a CONTRATADA encaminhará ao MUNICIPIO, mediante protocolo, a Fatura/Nota Fiscal, à qual deve estar anexada cópia do Certificado respectivo.

8.9 O pagamento será efetuado pelo Setor de Fazenda da Prefeitura, por processo legal, até o **30º (trigésimo)** dia corrido após liberação do repasse feito pelo governo para cada medição da obra mediante crédito em conta corrente da **CONTRATADA**, desde que obedecidas às formalidades contratuais e legais pertinentes, em consonância com o acompanhamento dos serviços efetuados pelo Departamento competente e o devido **Certificado de Medição**, e depois de atestado pelo órgão competente o cumprimento das obrigações devidas por parte da Contratada.

8.10 Em hipótese alguma serão efetivados pagamentos antecipados ou sem a existência do correspondente Certificado de Medição ou sem o atendimento no disposto 8.13.

8.11 No caso da execução não estar de acordo com as Especificações Técnicas e demais exigências fixadas neste Contrato, o MUNICIPIO fica, desde já, autorizado a reter o pagamento em sua integralidade, até que sejam processadas as alterações e retificações determinadas, aplicando-se à CONTRATADA a multa prevista na cláusula 7.0.

8.12 Durante o período de retenção, não correrão juros ou atualizações monetárias de natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste Contrato.

3.13 A CONTRATADA deverá apresentar junto a(s) Fatura(s)/Nota(s) Fiscal(is), o comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários junto ao INSS.

8.14 Os pagamentos serão efetuados pelo Setor de Fazenda do MUNICIPIO, por processo legal, até o **30º (trigésimo)** dia corrido após liberação do repasse feito pelo governo para cada medição da obra mediante crédito em conta corrente da **CONTRATADA** após apresentação das Faturas/Notas Fiscais e mediante a execução dos serviços, em consonância com a Ordem de Execução de Serviços – OES, requisição ou documento equivalente, efetuados pelo Departamento competente e o devido **Certificado de Medição**, e depois de atestado pelo órgão competente o cumprimento das obrigações devidas por parte da CONTRATADA.

8.15 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

8.16 O MUNICIPIO, no seu setor competente, verificará o exato cumprimento das obrigações da CONTRATADA, observando a relação de Serviços e materiais quanto à quantidade, à qualidade e ao atendimento do Contrato.

8.17 Os preços contratados serão revisados, por acordo das partes, sempre que cabalmente se verificar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em conformidade com o artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

8.18 O MUNICIPIO poderá descontar dos pagamentos, ou da garantia de seus eventuais reforços, importâncias que, a qualquer título, lhes sejam devidas pela CONTRATADA, por força deste Contrato.

9.0

**DO REGIME E PRAZO DE EXECUÇÃO**

Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, 100 - CNPJ: 17.935.412/0001-16 - Natércia - MG  
TELEFAX: (35) 3456-1238 - CEP: 37524-000



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, 100 - Centro - Natércia/MG  
CNPJ: 17.935.412/0001-16 - Tel/Fax. (35) 3456-1238 - Cep: 37524-000

CONFERE COM O ORIGINAL  
Natércia-MG 30/06/16  
Daniele Mayra da Cruz  
Gestora Municipal de Convênios  
CPF 087.804.186-94

9.1 Os Serviços a serem executados deverão ser realizados pela CONTRATADA no prazo de 90 dias (noventa) dias, contados da data da Ordem de Serviços, nas Ruas Especificadas, no Município de NATÉRCIA (MG), conforme Ordem de Execução dos Serviços - OES, Requisições ou documentos equivalentes. O MUNICIPIO não aceitará os serviços contratados que estiverem em desacordo com o ANEXO I do Edital, projetos e especificações técnicas ou documento equivalente; podendo ser prorrogado por igual ou inferior período, desde que obedecido o Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

9.2 A inobservância do prazo estipulado neste Contrato, ocasionará a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

9.3 O MUNICIPIO de NATÉRCIA (MG) não aceitará o objeto licitado que estiver em desacordo com o ANEXO I, não cabendo ao contratado qualquer espécie de indenização.

9.4 Substituirá, na forma da Lei a responsabilidade do licitante adjudicado pela qualidade, correção, garantia e segurança do objeto licitado.

### 10.0 DA TRANSFERENCIA DO CONTRATO

10.1 A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem poderá sub-contratar os serviços relativos ao seu objeto, sem expresse consentimento do MUNICIPIO, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste.

### 11.0 DAS RESPONSABILIDADES

11.1 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste Contrato e, conseqüentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o MUNICIPIO ou para terceiros.

11.2 A CONTRATADA é responsável pela análise e estudos de todos os documentos fornecidos pelo MUNICIPIO, para a execução dos serviços, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de tais documentos.

11.3 A CONTRATADA é, também, responsável por quaisquer diferenças, erros ou omissões nos Projetos ou desenhos que lhe forem fornecidos, ainda que relativos a quantidades.

### 12.0 DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

12.1 O MUNICIPIO indicará um técnico-gerente/fiscal que será o interlocutor de todos os contatos com a CONTRATADA, bem como o(s) agente(s) fiscalizador (es) do desenvolvimento dos trabalhos.

12.2 Ao nível de acompanhamento, deverão ser procedidas reuniões periódicas, na medida em que as necessidades do desenvolvimento dos trabalhos assim exigirem.

### 13.0 DOS REAJUSTES DE PREÇOS

13.1. Ocorrendo reajustamento de preços os mesmos serão reajustados observando o disposto do inciso II, Artigo 40 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, combinado com o inciso III Artigo 55 e inciso II alínea "d" parágrafo 6º do Artigo 65 do referido diploma legal.

### 14.0 DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO

14.1 A presente contratação é vinculada ao EDITAL DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇO 002/2016 e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2016.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA**  
Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, 100 – Centro - Natércia/MG  
CNPJ: 17.935.412/0001-16 - Tel/Fax. (35) 3456-1238 – Cep: 37524-000

CONFERE COM O ORIGINAL  
Natércia-MG 30/06/16  
Danielle Mayra da Cruz  
Gestora Municipal de Convênios  
CPF 087.804.186-94

## **15.0 DAS MARCAS PATENTES E LICENÇAS**

15.1 A CONTRATADA é a única responsável por eventuais inflações ao direito de uso de marcas, patentes ou licenças, responsabilizando-se pelo pagamento de royalties que forem devidos a terceiros, arcando com todas as despesas decorrentes de providências que forem tomadas para tanto.

## **16.0 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

16.1 As despesas decorrentes da execução do presente instrumento correrão por conta de dotações próprias, vigentes do presente exercício:

020901 15 451 0009 1.039 449051 - Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transportes - Calçamento/Pavimentação de Vias - CONSET - Obras e Instalações, F. 414,  
020901 15 451 0009 1.039 449051 - Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transportes - Calçamento/Pavimentação de Vias - Obras e Instalações, F. 415.

## **17.0 DOS CASOS DE RESCISÃO**

17.1 É facultado ao MUNICIPIO à rescisão do presente instrumento em qualquer fase de sua execução, mediante aviso escrito à CONTRATADA com antecedência mínima de sete dias. A CONTRATADA declara expressamente reconhecer os direitos do MUNICIPIO em caso de rescisão administrativa prevista na Lei 8.666/93, e alterações.

17.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no Art. 79, da Lei nº 8.666/93.

17.3 A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93. A Inexecução total ou parcial deste Contrato sem prévia justificativa, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no Art. 78, da Lei nº 8.666/93.

17.4 A rescisão contratual de que se trata o inciso I do artigo 78 acarreta as consequências previstas no artigo 80, inciso I a IV, ambos da Lei 8.666/93 e suas alterações. A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no Art. 79, da Lei nº 8.666/93.

17.5 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI do Artigo 78, da Lei 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se à, ainda ao pagamento de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do Contrato.

## **18.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

18.1 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao MUNICIPIO ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes na execução dos serviços contratados, isentando o MUNICIPIO de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo.

18.2 O MUNICIPIO reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços contratados, mediante pagamento único e exclusivo daqueles já executados.

18.3 O MUNICIPIO reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer serviço que não atender às especificações, ou que sejam considerados inadequados pela fiscalização.

18.4 A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes de trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria nº 3.214, de 08.07.78, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu



descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte do MUNICIPIO ou rescisão contratual com aplicação das sanções cabíveis.

18.5 Fica expressamente vedada a sub-contratação, sem prévia, expressa e escrita autorização do MUNICIPIO.

18.6 A CONTRATADA, por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a prover de sinalização os locais onde será executada a obra, colocando no mesmo, a partir do dia em que os trabalhos forem iniciados, placas e tapumes, bem como placa indicativa da obra, de acordo com o texto e padrão a serem apresentados pelo MUNICIPIO para prévia aprovação, bem como munir de segurança a obra até o recebimento da mesma, sem ônus para o MUNICIPIO.

18.7 Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei 8.666/93, que regulam as licitações e contratos promovidas pela Administração Pública e toda legislação civil-administrativa pertinente.

## **19.0 DA TOLERÂNCIA**

19.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício de outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou seus anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esse mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

## **20.0 DO VALOR DO CONTRATO**

20.1 As partes contratantes dão ao presente Contrato, o valor global de R\$ 370.337,83 (trezentos e setenta mil e trezentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos), para todos os legais e jurídicos efeitos.

## **21.0 DO FORO**

21.1 Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Natércia (MG), para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Prefeitura Municipal de Natércia (MG) 23 de maio 2016.

**Prefeitura Municipal de Natércia (MG) - Contratante**  
**Cristiano Antônio Caetano Junho - Prefeito Municipal**

**Adhobe Construtora Eireli - EPP - Contratada**

**CNPJ: 13.293.713/0001-32**

**Lucien Khoury - Representante Legal**

**CPF: 108.317.618-81**

**RG: 12.996.820**

Testemunhas: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA**  
Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, 100 – Centro - Natércia/MG  
CNPJ: 17.935.412/0001-16 - Tel/Fax. (35) 3456-1238 – Cep: 37524-000

**1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL**

**CONTRATO N.024/2016**

**Processo Licitatório Nº 050/2016**

**Tomada de Preços Nº 002/2016**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, n.º 100.

CNPJ: 17.935.412/0001-16

Natércia - MG

**CONTRATADO:** ADHOBE CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Rua Ariosto Buller Souto, nº 33, Conjunto 04 e 05, Pontal de Santa Marina

CNPJ: 13.293.713/0001-32

Caraguatatuba - SP

**DA JUSTIFICATIVA:** A prorrogação do prazo contratual é de interesse da CONTRATANTE e está sustentada nas seguintes razões:

I – em atendimento as exigências das áreas em que a contratada prestará serviços em conformidade com o contrato em vigor;

II – em decorrência do atraso na execução das Obras de Pavimentação em Blocos Intertravados e Bloquete, Retirada e Reassentamento Paralelepípedo e Bloquete e Execução de Sarjeta de 30 X 5 CM no Município de Natércia – MG, devido a obra está sendo executada em diversas ruas, porém, houve um atraso na execução por não poder interditar as vias da cidade. Desta forma se faz necessária à prorrogação do contrato com empresa Adhobe Construtora Eireli - EPP, para que possamos executar o serviço.

Fica prorrogado o contrato assinado em 23/05/2016 para até o dia 31/12/2016, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93, mantendo as demais cláusulas do contrato original em vigência.

E, por acharem as partes justas e contratadas, firmam o presente termo de prorrogação de prazo de contratual, em 03 vias de igual teor e forma, para que se produzam os jurídicos e legais efeitos.

Prefeitura Municipal de Natércia (MG) 18 de agosto 2016.


  
\_\_\_\_\_  
**Prefeitura Municipal de Natércia (MG) - Contratante**  
**Cristiano Antônio Caetano Junho - Prefeito Municipal**

  
\_\_\_\_\_  
**Adhobe Construtora Eireli - EPP - Contratada**  
**CNPJ: 13.293.713/0001-32**

**Lucien Khoury - Representante Legal**  
**CPF: 108.317.618-81 RG: 12.996.820**

**Testemunhas:**





## NOTIFICAÇÃO


**NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE NATÉRCIA**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 17.935.412/0001-16, com sede à Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, nº 100, Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Cristiano Antônio Caetano Junho**.

**NOTIFICADA: ADHOBE CONSTRUTORA EIRELI – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 13.293.713/0001-32, com sede à Ariosto Buller Souto, nº 33, Pontal de Santa Marina, Conjunto 04 e 05, em Caraguatatuba (SP).

O Município de Natércia vem por meio desta, notificar a Vossa Senhoria, para que no prazo, improrrogável, de cinco (05) dias, a contar do recebimento desta, para reiniciar as obras regularize a obra, conforme notificação de irregularidade – documentos em anexo – sob pena de adoção das medidas pertinentes à espécie.

A presente notificação vem alicerçada na legislação vigente, em especial a Constituição Federal e Lei nº 8.666/93.

Natércia, de 1º de fevereiro de 2017.



SN 556414873R

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRASON

14 FEV. 2017

UNIDADE DE ORIGEM / UNITE D'ORIGINE

MG

NOME DO REMETENTE / NOM DU RAYON SOCIAL DE L'EMPLOYEUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

PRAÇA PREFEITO JUSTINO LISBOA GOMES, 100, CENTRO

CIDADE / LOCALITE

NATERCIA

M. G.

3 3 5 2 4 0 0 0

PREVENCION DE VORVA

ADHOCBE CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ARISTO BULLER SOUZA, Nº 33 PONTAL SANTA MARINA

11672-130 CARAGUATATUBA

SP BRASIL

ANEXO PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOTIFICAÇÃO

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RECEPTEUR

R. Adilson de Almeida

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRASON


6/2/22

NOVO LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOU LEGIBLE DU RECEPTEUR

ASSINATURA DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGAO EXPEDIDOR

RUBRICA E VOTO DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT

R. M. 39222





### ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Aos 28 dias do mês de março de 2017, reunida a Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Natércia (MG), de modo a relatar as intercorrências ao longo do processo licitatório nº 050/2016, modalidade Tomada de Preços nº 002/2016, cujo objeto era a "contratação de empresa para pavimentação em blocos intertravados e bloquete, retirada e reassentamento de paralelepípedo e bloquete e execução de sarjeta de 30 X 5cm".

A licitação foi aberta em data de 04 de abril de 2016, sendo o edital publicado em 20 de abril de 2016.

Os envelopes de habilitação e preço foram abertos em 09 de maio de 2016, sendo declarada vencedora a empresa "Adhobe Construtora Eireli – EPP", ao valor de R\$ 370.337,83 (trezentos e setenta mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos).

O contrato foi firmado em data de 23 de maio de 2016, com prazo de duração de noventa (90) dias, ou seja, 20 de agosto de 2016.

Em data de 18 de agosto de 2016 foi feito o 1º termo de prorrogação de contrato, estendendo a data de duração até 31 de dezembro de 2016.

Foram feitas cinco (05) medições, num total de R\$ 240.560,54 (duzentos e quarenta mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos), da seguinte forma:

- 1ª medição – valor de R\$ 23.477,21;
- 2ª medição – valor de R\$ 14.026,97;
- 3ª medição – valor de R\$ 40.290,26;
- 4ª medição – valor de R\$ 44.025,32;
- 5ª medição – valor de R\$ 103.034,98;
- 6ª medição – valor de R\$ 15.705,80.

Enfim, faltaram R\$ 129.777,29 (cento e vinte e nove mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos).

Observe-se que a última medição ocorreu em 01 de novembro de 2016, quando a contratada não mais executou qualquer serviço, efetivamente abandonando o serviço. Restando ainda a ser executado 1.386,19 m de sarjeta e 5.264,43 m² de retirada e reassentamento de paralelepídeos.

Diante da omissão da empresa, e após vários contatos telefônicos com seus sócios e responsáveis, foi enviado uma notificação no dia 14/02/2017 para o comparecimento no prazo de 5 dias na Prefeitura Municipal de Natércia no qual a mesma foi recebido no dia 16/02/2017, diante da recalcitrância da contratada preferiu adotar a conduta de não mais prorrogar o contrato, o qual se findou em 31 de dezembro do ano passado.

Considerando todos estes fatores, a gestora municipal de convênios, Sra. Danielle Mayra da Cruz, entrou em contato com a SETOP, solicitando informações sobre os procedimentos a serem adotados em relação ao convênio, sendo orientada a elaborar uma declaração, constando os motivos da paralisação da obra, de modo a justificar nova licitação.

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA  
Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, 100 – Centro - Natércia/MG  
CNPJ: 17.935.412/0001-16 - Tel/Fax. (35) 3456-1238 – Cep. 37524-000



Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente ata, que vai por todos assinada.

**MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES:**

- MÁRCIO FÉLIX \_\_\_\_\_
- JÚLIO CÉSAR DA CUNHA \_\_\_\_\_
- THAÍS KELEN MARTINS \_\_\_\_\_
- LIGIANE ARANTES BORELI \_\_\_\_\_

**ASSESSOR JURÍDICO:**

- CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB/MG Nº 88.410 \_\_\_\_\_

**GESTORA DE CONVÊNIOS:**

- Danielle Mayra da Cruz \_\_\_\_\_

**ENGENHEIRO CIVIL:**

- Ludmar Gonçalves de Souza – CREA: 49180/D \_\_\_\_\_  
Ludmar Gonçalves de Souza  
CREA - MG 49180/D  
UFMG - 1988

**SECRETARIO DE OBRAS:**

- Enderson Luiz Rocha Maximiano \_\_\_\_\_  
Enderson Luiz Rocha Maximiano  
SECRETÁRIO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE  
MATRÍCULA: 929  
CPF: 173.540.448-90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA**  
**Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, 100 – Centro - Natércia/MG**  
**CNPJ: 17.935.412/0001-16 - Tel/Fax. (35) 3456-1238 – Cep: 37524-000**

**RETIFICAÇÃO DA ATA DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Às 14:00 Horas do Dia 17/09/2018 no Prédio da Prefeitura Municipal de Natércia, Reuniu-se a Comissão de Licitação Juntamente Com o Setor de Convênios para Retificação da Ata de Comissão do Dia 28 de Março de 2017 referente ao **PRC 050/16**, modalidade **Tomada de Preços 002/16**, Cujo Objeto É: **Contratação De Empresa Para Pavimentação em Blocos Intertravados e Bloquete, Retirada E Reassentamento De Paralelepípedo e Bloquete e Execução De Sarjeta De 30 X 5 CM.**

Na Ata Anterior foi Comunicado Que Foram Feitas 6 Medições, Sendo Que o Correto é 7 Medições, como segue abaixo:

- 1ª medição – valor de R\$23.477,21;
- 2ª medição – valor de R\$14.026,97;
- 3ª medição – valor de R\$40.090,26;
- 4ª medição – valor de R\$44.290,26;
- 5ª medição – valor de R\$103.034,98;
- 6ª medição – valor de R\$15.705,80;
- 7ª medição – valor de R\$11.333,40.




O Valor Total das medições Informado foi de R\$240.560,54 e o Valor Correto é R\$251.893,93.

O Saldo Final do Certame que a Empresa "Adhobe Construtora Eireli – EPP" deixou de realizar foi de R\$129.777,29, Sendo que o Valor Correto é R\$118.443,90.


Restando ainda a ser executado 1.386,19m de sarjeta e 5.264,43m² de retirada e reassentamento de paralelepídeos.

Nada Mais Havendo a Tratar a Presente Ata, Que Vai Por Todos Assinada.


**MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES:**

- MÁRCIO FÉLIX 
- JÚLIO CÉSAR DA CUNHA 
- THAÍS KELEN MARTINS 
- ROSÂNI APARECIDA FAUSTINO 

**GESTORA DE CONVÊNIOS:**

- ROSÂNI APARECIDA FAUSTINO 

**ENGENHEIRO CIVIL:**

- LUDMAR GONÇALVES DE SOUZA – CREA: 49180/D 

**SECRETARIO DE OBRAS:**

- ENDERSON LUIZ ROCHA MAXIMIANO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

**PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS**

| PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |                 | FOLHA Nº: 01       |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------|
| OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS E BLOQUETE , RETIRADA E REASSENTAMENTO PARALELEPÍPEDO E BLOQUETE E EXCUÇÃO DE SARJETA DE 30 X 5 CM |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |                 | FORMA DE EXECUÇÃO: |                   |            |
| LOCAL: RUAS DIVERSAS CONFORME CROQUI                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |                 | ( ) DIRETA         | ( X )<br>INDIRETA | LDI: 23,99 |
| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO SUL JUNHO/2015 PREÇO DE CUSTO COM A DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |                 |                    |                   |            |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |                 |                    |                   |            |
| Item                                                                                                                                          | Código      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | unidade | Quantidade | P. Unit. s/ LDI | P. Unit. c/ LDI    | total             |            |
| 1.0                                                                                                                                           | IIO-001     | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |                 |                    |                   |            |
| 1.1                                                                                                                                           | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UN      | 1,00       | PREFEITURA      |                    |                   |            |
| 2                                                                                                                                             | OBR-001     | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |                 |                    |                   |            |
|                                                                                                                                               |             | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS E BLOQUETES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                 |                    |                   |            |
| 2.4                                                                                                                                           | OBR VIA 206 | PARALELEPÍPEDO, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2      | 5.264,43   | R\$ 22,88       | R\$ 28,37          | R\$ 149.346,15    |            |
| 3.0                                                                                                                                           | DRE-SARJ    | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |                 |                    |                   |            |

|                     |              |                                                                                                                               |   |          |          |           |               |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|---------------|
| 3.1                 | DRE-SARJ-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, i= 3% PADRÃO DEOP MG<br>Valor unitario da Sarjeta com 30 cm de largura (regra de tres) = R\$ 9,73 | M | 1.386,19 | R\$ 9,73 | R\$ 12,06 | R\$ 16.723,31 |
| VALOR TOTAL DA OBRA |              |                                                                                                                               |   |          |          |           | 166.069,46    |

Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha: **LUDMAR GONÇALVES DE SOUZA** CAU OU CREA: 49108/D

Assinatura do Responsável Técnico: \_\_\_\_\_ Local e Data: \_\_\_\_\_

## MEMORIA DE CALCULO

### RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO

#### Rua São Pedro – Centro (Parte)

Área = 2.030,98 m<sup>2</sup> - Retirado do Auto CAD

#### Rua Prefeito Jose Goulart Junho – Centro

Área = 249,48 m<sup>2</sup> - Retirado do Auto CAD

#### Rua Joaquim Torquato – Centro

Área = 443,29 m<sup>2</sup> - Retirado do Auto CAD

#### Rua João Lisboa Carneiro – Centro

Área = 1.073,85 m<sup>2</sup> - Retirado do Auto CAD

#### Rua Coronel Paiva – Centro

Área = 1.294,65 m<sup>2</sup> - Retirado do Auto CAD

#### Rua Jose de Souza Campos – Centro

Área = 2.387,60 m<sup>2</sup> - TOTAL - Retirado do Auto CAD

Área = 2.215,42 m<sup>2</sup> – REALIZADA - Retirado do Auto CAD

Área = 172,18 m<sup>2</sup> – FALTANTE - Retirado do Auto CAD

**Total de Retirada e Reassentamento Paralelepípedo: 2.030,98 + 249,48 + 443,29 + 1.073,85 + 1.294,65 + 172,18 = 5.264,43 m<sup>2</sup>**



## **SARJETAS**

### **Rua São Pedro – Centro (Parte da área de Paralelepípedo)**

Sarjeta: Lado Direito 13,79 + 137,53 + 69,44 + 5,22 + Lado Esquerdo 88,83 + 159,63  
(13,79+137,53+69,44+5,22+88,83+159,63) = **474,44 M - 52,80 = 421,64 M**

### **Rua Prefeito Jose Goulart Junho – Centro**

Sarjeta: Lado Direito 33,71 + Lado Esquerdo 34,57 = **68,28 M**

### **Rua Joaquim Torquato – Centro**

Sarjeta: Lado Direito 41,59+35,64+Lado Esquerdo 88,99 (41,59+35,64+88,99) =  
**166,22 M**

### **Rua João Lisboa Carneiro – Centro**

Sarjeta: Lado Direito 197,57 + Lado Esquerdo 183,16 = **380,73 M**


### **Rua Coronel Paiva – Centro**

Sarjeta: Lado Direito 169,65 + Lado Esquerdo 179,67 = **349,32 M**

**Total da Sarjeta: 421,64 + 68,28 + 166,22 + 380,73+349,32 + = 1.386,19 M.**

Natercia 24/02/2017

ART : 2847291



---

LUDMAR GONÇALVES DE SOUSA  
CREA MG 49108/D



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA - MG

DATA: 12/05/2017

CONSTRUTORA SABINO & SOUZA LTDA-ME- CNPJ: 07.764.908/0001-10

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS E BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO PARALELEPÍPEDO E BLOQUETE E EXECUÇÃO DE SARJETA DE 30 X 5CM

FOLHA:01

LOCAL: DIVERSAS RUAS CONFORME CROQUI

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO SUL/JUNHO DE 2015 PREÇO DE CUSTO COM DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 E 12.844/2013

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

FORMA DE EXECUÇÃO

( ) DIRETA

( X ) INDIRETA

LDI = 23,99%

| ITEM                | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL    |
|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1.0                 | IIO-001      | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |                       |                       |                |
| 1.1                 | IIO-PLA-005  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UNID.   | 1,00       |                       | PREFEITURA            |                |
| 2.0                 | OBR-001      | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |                       |                       |                |
| 2.4                 | OBR-VIA-206  | PARALELEPÍPEDO, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m²      | 5.264,43   | 22,88                 | R\$ 16,90             | R\$ 88.968,87  |
| 3.0                 | DRE-SARJ     | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |                       |                       |                |
| 3.1                 | DRE-SARJ-005 | SARJETE TIPO 1 – 50 X 5CM, I = 3% PADRÃO DEOP MG – Valor unitário da sarjeta com 30cm de largura (regra de três) = R\$9,73                                                                                                                                                                                                                                                               | M       | 1.386,19   | 9,73                  | R\$ 11,99             | R\$ 16.620,42  |
| TOTAL GERAL DA OBRA |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |                       |                       | R\$ 105.589,29 |

RITA DE CÁSSIA RODRIGUES-CREA 35019/D-MG

*Luís Fernando Alves Peçanha*  
LUÍS FERNANDO ALVES PEÇANHA

RG:21.331.339-8 DETRANRJ

CPF:058.603.467-60

CONSTRUTORA SABINO E SOUZA LTDA ME

CNPJ: 07.764.908/0001-10

Rua Geraldo Ramos, Nº 51

Bairro João do Roque

Espera Feliz - MG

CEP: 36830-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA  
Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, 100 - Centro - Natércia/MG  
CNPJ: 17.935.412/0001-16 - Tel/Fax. (35) 3456-1238 - Cep: 37524-000



## TERMO DE CONTRATO Nº 030/2017

**MINUTA DE CONTRATO PARA RETOMADA E SEQUÊNCIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO E EXECUÇÃO DE SARJETA DE 30 X 5 CM NO MUNICÍPIO DE NATÉRCIA - MG.**

**REF. Tomada de Preço 002/2017  
PRC 035/2017**

Por este instrumento, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA (MG)**, com sede administrativa à Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, nº 100, inscrita no CNPJ MF sob o nº 17.935.412/0001-16, neste ato representado pelo Seu Prefeito, o Senhor Cristiano Antônio Caetano Junho, doravante chamado apenas MUNICIPIO, e de outra parte a Empresa **Construtora Sabino e Souza LTDA - ME**, inscrita no CNPJ Nº **07.764.908/0001-10** e Inscrição Estadual 1014246690.00-41, sediada à Rua Geraldo Ramos, nº 51, em 36.830-000, pela seu representante **Daniele Sabino Bessa de Souza**, inscrito no CPF sob o nº **096.130.477-43** e RG nº **020.853.566-6**, neste ato chamado apenas CONTRATADO, têm entre si como justo e acertado o presente Contrato para **Contratação de Empresa Para Retomada e Sequência Para Conclusão da Obra de Retirada e Reassentamento de Paralelepípedo e Execução de Sarjeta de 30 X 5 CM no Município de Natércia - MG**, em conformidade com o Processo Licitatório nº 035/2017, Tomada de Preço nº. 002/2017 e seus Anexos, sob a regência da Lei Federal 8.666/93, e alterações posteriores, e que se regerá pelas seguintes condições:

### 1.0 DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

1.1 A CONTRATADA se obriga perante o MUNICIPIO a executar a **Retomada e Sequência Para Conclusão da Obra de Retirada e Reassentamento de Paralelepípedo e Execução de Sarjeta de 30 X 5 CM no Município de Natércia - MG**, com as características e quantidades indicadas no ANEXO I do Edital da Tomada de Preço nº 002/2017, juntamente com as especificações técnicas e projetos e conforme Quadro Resumo das Propostas a que correspondem este pacto.

1.2 A Execução dos serviços relacionados no ANEXO I e conforme especificações técnicas e projetos serão feitos diretamente nas **diversas Ruas do Município de Natércia - MG Conforme Memória de Cálculo** pela CONTRATADA, mediante requisição/autorização emitida pela Administração, devidamente autorizada por autoridade superior.

1.3 A CONTRATADA obriga-se a manter a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar o MUNICIPIO, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.

1.4 A Firma contratada para a execução dos serviços, objeto do presente instrumento, obrigar - se, ainda, á:

1.4.1 Executar os serviços licitados na quantidade solicitada pelo Município, através de requisição, até a quantidade total licitada;

1.4.2 Fornecer á Licitadora as competentes notas fiscais referentes aos serviços efetuados, em conformidade com a solicitação do Município, especificações técnicas e projetos;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA**  
**Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, 100 – Centro - Natércia/MG**  
**CNPJ: 17.935.412/0001-16 - Tel/Fax. (35) 3456-1238 – Cep: 37524-000**



1.4.3 Utilizar exclusivamente produtos e serviços de boa qualidade e que atendam as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, existentes e aplicáveis quanto ao fornecimento do objeto desta licitação para o correto atendimento às necessidades da Administração;

1.4.4 Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas com pessoas envolvidas na execução do fornecimento, que não terão vínculo empregatício com a licitadora;

1.4.5 Assumir a total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham causar ao patrimônio da licitadora ou a terceiros, quando da execução do fornecimento, objeto deste instrumento;

1.4.6 Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões até o limite fixado no § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93.

## **2.0 DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES**

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da execução do objeto da presente licitação, bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os Seus Anexos, os seguintes documentos:

- a- Tomada de Preço nº 002/2017 e seus anexos com especificações técnicas e projetos.
- b- Proposta da CONTRATADA, e
- c- Quadro Resumo das Propostas.

2.2 Os Documentos referidos no presente item, são considerados suficientes para, em complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.

## **3.0 DA VIGÊNCIA**

3.1 O presente Contrato vigorará de 23 de junho de 2017 até 31 de Dezembro de 2017, totalizando o prazo de 90 dias (noventa) dias, contados da data de firmamento do presente ajuste e de acordo com o cronograma de execução e proposta apresentados pela CONTRATADA, podendo ser renovado em conformidade com a Lei 8.666/93.

## **4.0 DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

4.1 O objeto contratual será recebido provisoriamente pelo técnico responsável por seu acompanhamento e fiscalização que for designado pelo MUNICIPIO para tanto, mediante termo assinado pelas partes, dentro de 15 (QUINZE) dias contados da data de comunicação escrita de seu termino para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços e produtos com as especificações e consequente aceitação e rejeição.

4.2 Durante o período de 30 (Trinta) dias da data de expedição do termo supra, a obra ficará sob observação, de molde a se verificar o cumprimento das exigências construtivas.

4.3 Esgotado o prazo previsto na Clausula Anterior e uma vez restando comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, a obra será recebida definitivamente, por servidor ou comissão designada pelo MUNICIPIO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

4.4 O MUNICIPIO reserva-se o direito não receber os serviços e produtos em desacordo com o previsto neste instrumento, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93.

## **5.0 GARANTIAS TÉCNICAS E REPARAÇÕES**

5.1 Após recebimento definitivo do objeto contratual, por parte do MUNICIPIO, a empresa CONTRATADA ficará, ainda, responsável pelo prazo de 3 (três) anos, contados da data de firmamento do Termo de



Recebimento Definitivo, por quaisquer defeitos, ainda que resultantes dos materiais empregados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, obrigando-se às suas expensas, às reparações e/ou substituições que se fizerem necessárias para o perfeito cumprimento do Contrato.

5.2 Se a CONTRATADA não executar os reparos e/ou substituições, nos prazos que lhe forem determinados pelo MUNICIPIO, este, se assim lhe convier, poderá mandar executá-los por conta e risco daquela, por outras empresas, cobrando-lhes os respectivos custos.

## **6.0 GARANTIAS DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**

6.1 As Garantias prestadas pela CONTRATADA no ato da assinatura deste Contrato, como elemento assecuratório do cumprimento das obrigações contratuais, será devolvida logo após a plena, perfeita e correta execução do convencionado.

## **7.0 PENALIDADES**

7.1 Ocorrendo atraso injustificado na execução do contrato, tendo por base o Cronograma Físico que é parte integrante da Tomada de Preço 002/2017 e deste, importará na aplicação à CONTRATADA de multa diária na ordem de 0.3% (três décimos por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor dos serviços não Realizados.

7.2 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto, não executado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o consequente cancelamento da nota de empenho, contrato ou documento correspondente.

7.3 O recolhimento das multas retro referidas deverá ser feito, através de guia própria, ao MUNICIPIO de NATÉRCIA (MG), no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que foi aplicada.

7.4 A execução do(s) serviço(s) fora das características originais, também ocasionará a incidência de multa prevista em 7.1, pois nessa situação a desconformidade de especificações equivalerá ao não fornecimento ou execução.

7.5 À CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 7.1, no caso da mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste.

7.6 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.

7.7 A inexecução total do Contrato, importará a CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta no Município de NATÉRCIA (MG), pelo prazo desde já fixado de 24 meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor do contrato.

7.8 Será propiciada Ampla Defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos itens precedentes.

7.9 Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos que a CONTRATADA tiver direito, ou cobrado judicialmente.

7.10 Na eventualidade de ocorrer atraso no pagamento, o valor será atualizado pela variação acumulada do INPC, ou outro valor que o substitua, ocorrida entre a data de sua exigibilidade e a do referido pagamento, calculada *pro rata tempore*.

7.11 Para a hipótese definida em 7.9, a CONTRATADA fica obrigada a emitir fatura suplementar, identificando de forma clara de que se trata de valor pertinente à atualização financeira originária de pagamento de fatura em atraso por inadimplemento do MUNICIPIO.

## **8.0 DO PREÇO, MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA**  
**Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, 100 – Centro - Natércia/MG**  
**CNPJ: 17.935.412/0001-16 - Tel/Fax. (35) 3456-1238 – Cep: 37524-000**



- 8.1 Os Pagamentos pela execução dos serviços, objeto decorrentes da presente Licitação, serão efetuados, Pela Prefeitura Municipal de NATÉRCIA (MG), por processo legal, observada a Proposta Comercial apresentada até o **30º (trigésimo)** dia corrido após liberação do repasse feito pelo governo para cada medição da obra mediante crédito em conta corrente da **CONTRATADA**, desde que obedecidas às formalidades contratuais e legais pertinentes, em consonância com o acompanhamento dos serviços efetuados pelo Departamento competente e o devido **Certificado de Medição**, e depois de atestado pelo órgão competente o cumprimento das obrigações devidas por parte da Contratada.
- 8.2 O preço total para a execução da Obra, objeto deste Contrato, são os apresentados na proposta da **CONTRATADA** e conforme apurado no Quadro Resumo das Propostas, devidamente aprovada pelo MUNICIPIO, o qual totaliza o valor de R\$ 105.589,29 (Cento e Cinco Mil e Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos).
- 8.3 Os Preços unitário e Global retro referidos, são finais, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da **CONTRATADA**.
- 8.4 Os preços dos serviços a serem executados deverão ser estipulados, de forma unitária, em moeda oficial, já incluído os tributos, fretes e seguros e demais encargos. Os preços apresentados não poderão ser além do preço de mercado.
- 8.5 A cada 15 dias de fluência do prazo de execução, o MUNICIPIO através de agentes fiscalizadores, realizará medição dos trabalhos executados, emitindo o correspondente Certificado de Medição.
- 8.6 Os valores dos itens de serviços executados e medidos serão calculados multiplicando-se as quantidades medidas pelos respectivos preços unitários.
- 8.7 O valor de cada medição será obtido pelo somatório dos valores dos itens de serviços medidos no período de referencia.
- 8.8 Com base nos Certificados de Medição emitidos pela fiscalização, a **CONTRATADA** encaminhará ao MUNICIPIO, mediante protocolo, a Fatura/Nota Fiscal, à qual deve estar anexada cópia do Certificado respectivo.
- 8.9 O pagamento será efetuado pelo Setor de Fazenda da Prefeitura, por processo legal, até o **30º (trigésimo)** dia corrido após liberação do repasse feito pelo governo para cada medição da obra mediante crédito em conta corrente da **CONTRATADA**, desde que obedecidas às formalidades contratuais e legais pertinentes, em consonância com o acompanhamento dos serviços efetuados pelo Departamento competente e o devido **Certificado de Medição**, e depois de atestado pelo órgão competente o cumprimento das obrigações devidas por parte da Contratada.
- 3.10 Em hipótese alguma serão efetivados pagamentos antecipados ou sem a existência do correspondente Certificado de Medição ou sem o atendimento no disposto 8.13.
- 8.11 No caso da execução não estar de acordo com as Especificações Técnicas e demais exigências fixadas neste Contrato, o MUNICIPIO fica, desde já, autorizado a reter o pagamento em sua integralidade, até que sejam processadas as alterações e retificações determinadas, aplicando-se à **CONTRATADA** a multa prevista na cláusula 7.0.
- 8.12 Durante o período de retenção, não correrão juros ou atualizações monetárias de natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste Contrato.
- 8.13 A **CONTRATADA** deverá apresentar junto a(s) Fatura(s)/Nota(s) Fiscal(is), o comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários junto ao INSS.
- 8.14 Os pagamentos serão efetuados pelo Setor de Fazenda do MUNICIPIO, por processo legal, até o **30º (trigésimo)** dia corrido após liberação do repasse feito pelo governo para cada medição da obra mediante crédito em conta corrente da **CONTRATADA** após apresentação das Faturas/Notas Fiscais e mediante a execução dos serviços, em consonância com a Ordem de Execução de Serviços – OES, requisição ou documento equivalente, efetuados pelo Departamento competente e o devido **Certificado de Medição**, e depois de atestado pelo órgão competente o cumprimento das obrigações devidas por parte da **CONTRATADA**.
- 8.15 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.



8.16 O MUNICIPIO, no seu setor competente, verificará o exato cumprimento das obrigações da CONTRATADA, observando a relação de Serviços e materiais quanto à quantidade, à qualidade e ao atendimento do Contrato.

8.17 Os preços contratados serão revisados, por acordo das partes, sempre que cabalmente se verificar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em conformidade com o artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

8.18 O MUNICIPIO poderá descontar dos pagamentos, ou da garantia de seus eventuais reforços, importâncias que, a qualquer título, lhes sejam devidas pela CONTRATADA, por força deste Contrato.

## **9.0 DO REGIME E PRAZO DE EXECUÇÃO**

9.1 Os Serviços a serem executados deverão ser realizados pela CONTRATADA no prazo de 90 dias (noventa) dias, contados da data da Ordem de Serviços, nas Ruas Especificadas, no Município de NATÉRCIA (MG), conforme Ordem de Execução dos Serviços – OES, Requisições ou documentos equivalentes. O MUNICIPIO não aceitará os serviços contratados que estiverem em desacordo com o ANEXO I do Edital, projetos e especificações técnicas ou documento equivalente; podendo ser prorrogado por igual ou inferior período, desde que obedecido o Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

9.2 A inobservância do prazo estipulado neste Contrato, ocasionará a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

9.3 O MUNICIPIO de NATÉRCIA (MG) não aceitará o objeto licitado que estiver em desacordo com o ANEXO I, não cabendo ao contratado qualquer espécie de indenização.

9.4 Substituirá, na forma da Lei a responsabilidade do licitante adjudicado pela qualidade, correção, garantia e segurança do objeto licitado.

## **10.0 DA TRANSFERENCIA DO CONTRATO**

10.1 A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem poderá sub-contratar os serviços relativos ao seu objeto, sem expresse consentimento do MUNICIPIO, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste.

## **11.0 DAS RESPONSABILIDADES**

11.1 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste Contrato e, conseqüentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o MUNICIPIO ou para terceiros.

11.2 A CONTRATADA é responsável pela análise e estudos de todos os documentos fornecidos pelo MUNICIPIO, para a execução dos serviços, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de tais documentos.

11.3 A CONTRATADA é, também, responsável por quaisquer diferenças, erros ou omissões nos Projetos ou desenhos que lhe forem fornecidos, ainda que relativos a quantidades.

## **12.0 DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO**

12.1 O MUNICIPIO indicará um técnico-gerente/fiscal que será o interlocutor de todos os contatos com a CONTRATADA, bem como o(s) agente(s) fiscalizador (es) do desenvolvimento dos trabalhos.

12.2 Ao nível de acompanhamento, deverão ser procedidas reuniões periódicas, na medida em que as necessidades do desenvolvimento dos trabalhos assim exigirem.

## **13.0 DOS REAJUSTES DE PREÇOS**



13.1. Ocorrendo reajustamento de preços os mesmos serão reajustados observando o disposto do inciso II, Artigo 40 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, combinado com o inciso III Artigo 55 e inciso II alínea "d" parágrafo 6º do Artigo 65 do referido diploma legal.

#### **14.0 DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO**

141.1 A presente contratação é vinculada ao EDITAL DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇO 002/2017 e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2017.

#### **15.0 DAS MARCAS PATENTES E LICENÇAS**

15.1 A CONTRATADA é a única responsável por eventuais inflações ao direito de uso de marcas, patentes ou licenças, responsabilizando-se pelo pagamento de royalties que forem devidos a terceiros, arcando com todas as despesas decorrentes de providências que forem tomadas para tanto.

#### **16.0 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

16.1 As despesas decorrentes da execução do presente instrumento correrão por conta de dotações próprias, vigentes do presente exercício:

020901 15 451 0009 1.039 449051 - Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transportes - Calçamento/Pavimentação de Vias - CONSET - Obras e Instalações, F. 400,  
020901 15 451 0009 1.039 449051 - Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transportes - Calçamento/Pavimentação de Vias - Obras e Instalações, F. 401.

#### **17.0 DOS CASOS DE RESCISÃO**

17.1 É facultado ao MUNICIPIO à rescisão do presente instrumento em qualquer fase de sua execução, mediante aviso escrito à CONTRATADA com antecedência mínima de sete dias. A CONTRATADA declara expressamente reconhecer os direitos do MUNICIPIO em caso de rescisão administrativa prevista na Lei 8.666/93, e alterações.

17.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no Art. 79, da Lei nº 8.666/93.

17.3 A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93. A Inexecução total ou parcial deste Contrato sem prévia justificativa, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no Art. 78, da Lei nº 8.666/93.

17.4 A rescisão contratual de que se trata o inciso I do artigo 78 acarreta as consequências previstas no artigo 80, inciso I a IV, ambos da Lei 8.666/93 e suas alterações. A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no Art. 79, da Lei nº 8.666/93.

17.5 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI do Artigo 78, da Lei 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se à, ainda ao pagamento de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do Contrato.

#### **18.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

18.1 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao MUNICIPIO ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes na execução dos serviços contratados, isentando o MUNICIPIO de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA**  
**Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, 100 – Centro - Natércia/MG**  
**CNPJ: 17.935.412/0001-16 - Tel/Fax. (35) 3456-1238 – Cep: 37524-000**



18.2 O MUNICIPIO reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços contratados, mediante pagamento único e exclusivo daqueles já executados.

18.3 O MUNICIPIO reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer serviço que não atender às especificações, ou que sejam considerados inadequados pela fiscalização.

18.4 A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes de trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria nº 3.214, de 08.07.78, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte do MUNICIPIO ou rescisão contratual com aplicação das sanções cabíveis.

18.5 Fica expressamente vedada a sub-contratação, sem prévia, expressa e escrita autorização do MUNICIPIO.

18.6 A CONTRATADA, por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a prover de sinalização os locais onde será executada a obra, colocando no mesmo, a partir do dia em que os trabalhos forem iniciados, placas e tapumes, bem como placa indicativa da obra, de acordo com o texto e padrão a serem apresentados pelo MUNICIPIO para prévia aprovação, bem como munir de segurança a obra até o recebimento da mesma, sem ônus para o MUNICIPIO.

18.7 Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei 8.666/93, que regulam as licitações e contratos promovidas pela Administração Pública e toda legislação civil-administrativa pertinente.

## **19.0 DA TOLERÂNCIA**

19.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício de outra, permitir, mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou seus anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esse mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

## **20.0 DO VALOR DO CONTRATO**

20.1 As partes contratantes dão ao presente Contrato, o valor global de R\$ 105.589,29 (Cento e Cinco Mil e Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos), para todos os legais e jurídicos efeitos.

## **21.0 DO FORO**

21.0 Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Natércia (MG), para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Prefeitura Municipal de Natércia (MG) 23 de junho 2017.

Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, 100 - CNPJ: 17.935.412/0001-16 - Natércia - MG  
TELEFAX: (35) 3456-1238 - CEP: 37524-000


Rosâni Aparecida Faustino  
CPF: 098.232.546-05

FERE COM O ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA  
Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, 100 - Centro - Natércia/MG  
CNPJ: 17.935.412/0001-16 - Tel/Fax. (35) 3456-1238 - Cep: 37524-000




  
\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Natércia (MG) - Contratante  
Cristiano Antônio Caetano Junho - Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
Construtora Sabino e Souza LTDA - ME- Contratada  
CNPJ: 07.764.908/0001-10  
Daniele Sabino Bessa de Souza - Representante Legal  
CPF: 096.130.477-43 RG: 020.853.566-6

Testemunhas:

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

CONFERE COM O ORIGINAL  
Natércia-MG 

Rosâni Aparecida Faustino  
CPF: 098.232.546-05

Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, 100 - CNPJ: 17.935.412/0001-16 - Natércia - MG  
TELEFAX: (35) 3456-1238 - CEP: 37524-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA  
Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, 100 – Centro - Natércia/MG  
CNPJ: 17.935.412/0001-16 - Tel/Fax. (35) 3456-1238 – Cep: 37524-000



**1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL**

**CONTRATO N.030/2017**

**Processo Licitatório Nº 035/2017**

**Tomada de Preços Nº 002/2017**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA  
Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, n.º 100.  
CNPJ: 17.935.412/0001-16  
Natércia - MG

**CONTRATADO:** CONSTRUTORA SABINO E SOUZA LTDA - ME  
Rua Geraldo Ramos, nº 51, Bairro João do Roque  
CNPJ: 07.764.908/0001-10  
Espera Feliz - MG

**DA JUSTIFICATIVA:** A prorrogação do prazo contratual é de interesse da CONTRATANTE e está sustentada nas seguintes razões:

I - em atendimento a realização dos serviços prestados pela empresa em conformidade com o contrato em vigor.


II - em decorrência da não conclusão da obra, pois, devido a períodos de chuvas não foi possível que a empresa Construtora Sabino e Souza LTDA - ME executasse a Obra de Retomada e Sequência Para Conclusão da Obra de Retirada e Reassentamento de Paralelepípedo e Execução de Sarjeta de 30 X 5 CM no Município de Natércia - MG.


III - em decorrência de serviços realizados no município de Natércia em conformidade com a previsão legal na Lei Federal nº 8.666/93.

Fica prorrogado o contrato inicial assinado em 23/06/2017 para até o dia 30/06/2018, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93, mantendo as demais cláusulas do contrato original em vigência.

E, por acharem as partes justas e contratadas, firmam o presente termo de prorrogação de prazo de contratual, em 03 vias de igual teor e forma, para que se produzam os jurídicos e legais efeitos.

Prefeitura Municipal de Natércia (MG) 29 de dezembro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Natércia (MG) - Contratante  
Cristiano Antônio Caetano Junho - Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
Construtora Sabino e Souza LTDA - ME - Contratada  
CNPJ: 07.764.908/0001-10

Daniele Sabino Bessa de Souza - Representante Legal  
CPF: 096.130.477-43 RG: 020.853.566-6

Testemunhas: \_\_\_\_\_

Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, 100 - CNPJ: 17.935.412/0001-16 - Natércia - MG  
TELEFAX: (35) 3456-1238 - CEP: 37524-000



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas  
Subsecretaria de Infraestrutura  
Superintendência de Infraestrutura Municipal  
Diretoria de Gestão de Convênios

OFÍCIO DGC Nº 323/19

Belo Horizonte, 22 de maio de 2019.

*Ref.: 2º Termo Aditivo ao Convênio 5191000053/2016*

*Prorrogação de vigência;*

*Ampliação de metas;*


*Inclusão nova Dotação Orçamentária.*


Senhor (a) Prefeito(a).

Encaminhamos a V. Exa., o Termo Aditivo do convênio em referência, acompanhado do plano de trabalho e da publicação no Diário Oficial do Estado "Minas Gerais"; convênio este celebrado entre a Minas Gerais Participações (MGI) e o município de **NATÉRCIA** com a interveniência da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (SETOP).

**Alertamos** que, em consonância com o Decreto vigente, o ajuste é limitado para execução do respectivo objeto, á sessenta meses. Desta forma, orienta-se ao conveniente, que evidencie todos os esforços possíveis para concluir os serviços obedecendo este prazo estipulado pela legislação.

Atenciosamente,

  
Adair Carlos De Souza Soares  
Diretor de Gestão de Convênios


  
Rafael de Freitas Morais  
Superintendente de Infraestrutura Municipal

Exmo(a). Sr(a).  
Prefeito(a) Municipal  
**NATÉRCIA – MG**

**Segundo Termo Aditivo ao Convênio de  
Cooperação Técnica e Financeira nº  
5191000053/2016, celebrado entre a MGI e  
o Município de Natércia, com  
interveniência do Estado de Minas Gerais,  
por intermédio da SETOP.**

A **MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A**, doravante denominada **MGI**, Sociedade Anônima, criada em 19 de agosto de 1976, cujo ato constitutivo foi arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 394.363/76, inscrita no CNPJ nº 19.296.342/0001-29, com sede em Belo Horizonte/MG, Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Prédio Gerais, 4º andar, Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.001, Bairro Serra Verde, neste ato representada por dois de seus Diretores signatários, na forma do Estatuto Social, **Dr. Antonio Eustaquio da Silveira**, Diretor-Presidente, CREA 30043, CPF: 448.968.836-91, brasileiro, casado, engenheiro, residente à Rua Aristóteles Caldeira, 1010, apto 502, Grajaú, CEP 30431-108, Belo Horizonte/MG; **Nilma Gonçalves dos Santos** - brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade nº MG-7.105.180, emitida pela SSPMG, inscrita no CPF sob o número 001.383.996-97, residente à Rua Tapira, 377, Bairro Renascença, Belo Horizonte/MG e o **Município de Natércia**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.935.412/0001-16, com sede administrativa na Praça Prefeito Justino Lisboa Carneiro, nº 100, Centro, Natércia/MG, CEP 37.524-000, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) **Cristiano Antônio Caetano Junho**, portador(a) da carteira de identidade nº M-2.578.668 SSP/MG, inscrito no CPF nº 446.408.896-15, residente no Sítio Santo Antônio, Atirado, Zona Rural de Natércia/MG, CEP 37.524-000, com a intervenção do **ESTADO DE MINAS GERAIS**, por intermédio da

**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS**





## CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Termo Inicial e que não foram modificadas de modo expresse por este instrumento.

## CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO ADITIVO


O presente aditivo passa a vigorar a partir de sua assinatura.

## CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICIDADE


A SETOP providenciará a publicação do extrato do presente Termo Aditivo, no Diário Oficial do Estado, no prazo máximo de 20 dias a contar de sua assinatura.

Assim avençadas, as partes assinam este Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, para fins de publicação e de direito.

Belo Horizonte, 24 de Abril de 2019.


  
Diretor da MGI  
CONCEDENTE

Antônio Eustáquio da Silveira  
Diretor-Presidente

  
Diretor da MGI  
CONCEDENTE

Márcia Alves dos Santos  
Diretora Administrativo - Financeira  
e Relações com Investidores

  
Cristiano Antônio Caetano Junho  
Prefeito(a) Municipal de Natércia  
CONVENIENTE


  
Marco Aurélio de Barcelos Silva  
Secretário da SETOP  
INTERVENIENTE


  
Cristiane Helen Ribeiro Azevedo  
Advogada - Assistente I  
OAB-MG 88.311  
Matrícula 189

Para NET, admo  
a hda jurídica  
de fls 448/456



### TESTEMUNHAS

1) Nome legível: Ruy Guedes Medeiros  
CPF: 034.731.496-16  
Endereço: Bairro Cruzeiro - Ibirité  
C.I.: CEP: 32.400-000  
Assinatura: 

2) Nome legível: Silvia Gonçalves dos Santos  
CI: MG 11.906.733  
Endereço: CPF: 061.480.676-33  
C.I.: 31.535-100 - HP 103 - BH/MG  
Assinatura: 

NÚMERO DE REGISTRO DO SIGCON-SAÍDA: 5191000053/2016

DATA DO REGISTRO: 21/12/2018

TERMO ADITIVO DE AMPLIAÇÃO DE METAS E PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA.

## I - IDENTIFICAÇÃO DO DOENTE

OSERO

|                                                                      |        |                          |                         |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------|
| Razão social: MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.                        |        | CNPJ: 19.296.342/0001-29 |                         |
| Endereço: Rodovia Prefeito Américo Gianetti, nº 4.143                |        | Bairro: SERRA VERDE      |                         |
| Cidade: BELO HORIZONTE                                               | UF: MG | CEP: 30.315-510          | Telefone: (31)3915-4840 |
| E-mail do Setor de Convênio/Parceria: subinfra@transportes.mg.gov.br |        |                          |                         |

## DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

|                                                      |        |                                                 |  |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--|
| Nome completo: Antonio Eustáquio da Silveira         |        | CPF: 448.968.836-91                             |  |
| CI/Órgao Exp.: Mg 1057711/                           |        | Cargo: DIRETOR                                  |  |
| Endereço residencial: Rua Aristóteles Caldeira, 1010 |        | Bairro: Grajaú                                  |  |
| Cidade: BELO HORIZONTE                               | UF: MG | CEP: 30.315-510                                 |  |
| Telefone do setor de convênios: (31) 3915-8344       |        | E-mail setor de convênios: gegab@mgipart.com.br |  |

## DADOS DO CONVENENTE/OSC PARCEIRA

|                                                       |        |                                                    |  |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--|
| Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA        |        | CNPJ: 17.935.412/0001-16                           |  |
| Endereço: PRAÇA PREFEITO JUSTINO LISBOA CARNEIRO, 100 |        | Bairro: CENTRO                                     |  |
| Cidade: NATERCIA                                      | UF: MG | CEP: 37.524-000                                    |  |
| Telefone/FAX: (35) 3456-1238                          |        | E-mail institucional: andrezza_pereira@hotmail.com |  |

## DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

|                                                |                 |                                                 |  |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--|
| Nome completo: Cristiano Antônio Caetano Junho |                 | CPF: 446.408.896-15                             |  |
| CI/Órgao Exp.: M-2.578.668/sspmg               | Cargo: Prefeito | Data de Vencimento do Mandato: 31/12/2020       |  |
| Endereço residencial: Sítio Santo Antonio      |                 | Bairro: Atirado - Zona Rural                    |  |
| Cidade: NATERCIA                               | UF: MG          | CEP: 37.524-000                                 |  |
| Telefone pessoal: (35) 3456-1238               |                 | E-mail pessoal: prefeitura.natercia@hotmail.com |  |

## DADOS DO INTERVENIENTE

|                                                           |        |                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|--|
| Razão social: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS |        | CNPJ: 18.715.581/0001-03                             |  |
| Endereço: Rodovia Prefeito Américo Gianetti, nº 4.143     |        | Bairro: SERRA VERDE                                  |  |
| Cidade: BELO HORIZONTE                                    | UF: MG | CEP: 31.630-900                                      |  |
| Telefone/FAX: (031) 3915-8317                             |        | E-mail institucional: subinfra@transportes.mg.gov.br |  |

## DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

|                                                |                   |                     |  |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--|
| Nome completo: Marco Aurélio de Barcelos Silva |                   | CPF: 013.543.946-90 |  |
| CI/Órgao expedidor: OAB 139844 OAB             | Cargo: SECRETÁRIO |                     |  |

NÚMERO DE REGISTRO DO SIGCON-SAÍDA: 5191000053/2016

DATA DO REGISTRO: 21/12/2018

Endereço residencial: RUA PROFESSOR ALMEIDA CUNHA, 491

Bairro: SÃO LUIZ

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 31.270-730

Telefone pessoal: (31) 3915-8260

E-mail pessoal: gabinete@transportes.mg.gov.br

1 - Tipo de Instrumento: CONVÊNIO

1.1 - Chamamento Público? NÃO

1.1.1 - Número/Ano do Edital: -

2 - Repasse de Natureza Especial? SIM

2.1 - Natureza Especial: REPASSE MGI

2.2 - Fundamentação legal para a natureza especial do repasse: Art. 22, §6º, do Decreto Estadual nº46.319/2013

Origem dos recursos: Concedente - Contrapartida

3.1 - Contrapartida: Financeira: R\$ 7597,08

3.1.1 - Dotação Orçamentária da Contrapartida Financeira: 020901.15451.0014.1012.449051

## REFORMA OU OBRAS

|                    | Valor Anterior | Valor Alteração | Valor Atualizado |
|--------------------|----------------|-----------------|------------------|
| Concedente/OEEP    | R\$ 500.000,00 | R\$ 0,00        | R\$ 500.000,00   |
| Emenda Parlamentar | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        | R\$ 0,00         |
| Interveniente      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        | R\$ 0,00         |
| Contrapartida      | R\$ 7.597,08   | R\$ 0,00        | R\$ 7.597,08     |
| Rendimentos        | R\$ 0,00       | R\$ 34.039,05   | R\$ 34.039,05    |
| Saldo em conta     | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        | R\$ 0,00         |
| Total (R\$)        | R\$ 507.597,08 | R\$ 34.039,05   | R\$ 541.636,13   |

## 6 - Descrição DETALHADA do objeto:

Pavimentação de vias públicas com execução de retirada e reassentamento de piso de concreto intertravado, paralelepípedo e bloquete.

## 6.1 - Endereço da obra ou local do evento, de prestação do serviço ou de entrega do bem (dependendo do objeto):

| Rua/Avenida/<br>Rodovia/Beco/Travessa:                               | Número/KM: | Bairro/Distrito:                    | CEP        | Município: | Referência:       |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| José Teodoro dos Reis, Pedro Eufrásio e<br>Geraldo Honorato de Souza | 1          | Diversos                            | 37.524-000 | NATERCIA   | Posto Alexandrina |
| Diversas Ruas                                                        | 1500       | Centro/ Chapada / Santa<br>Catarina | 37.524-000 | NATERCIA   | Diversas Ruas     |

## 7 - Justificativa FUNDAMENTADA, objetivos e finalidade do convênio de saída:

A implantação do retirada e reassentamento do calçamento nas vias públicas é de fundamental importância, e se faz necessária, devido às condições precárias das vias. Consequentemente, tal benfeitoria resultará numa melhoria na qualidade de vida dos habitantes e no desenvolvimento desta região.

## 8 - Pessoas beneficiadas diretamente

8.1 - Descrição: População

8.2 - Quantidade: 4821

9 - Proposta de vigência (dias corridos): 1392

10 - Conta específica

**ALTERAÇÃO DE CONVÊNIO/ PARCERIA**

NÚMERO DE REGISTRO DO SIGCON-SAÍDA: 5191000053/2016

DATA DO REGISTRO: 21/12/2018

FLS.:

439

10.1 - Banco:

1

10.2 - Agência bancária:

4063-0

10.3 - Conta bancária:

12558-x

10.4 - Praça bancária:

Heliadora

10.4.1 - Justificativa de escolha de praça bancária diferente do município do conveniente (se for o caso):

No Município de Natercia não temos banco do Brasil

**11 - Equipe executora do convênio de saída/parceria:**

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO

10.1 - NOME

10.2 - REGISTRO  
PROFISSIONAL

10.3 - TELEFONE

10.4 - E-MAIL

Ludmar Gonçalves de Souza

CREA 49108/D

(35) 3456-1238

danyntc@hotmail.com

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA DOCUMENTAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS

10.1 - NOME

10.2 - REGISTRO  
PROFISSIONAL

10.3 - TELEFONE

10.4 - E-MAIL

Cristiano Antônio Caetano Junho

1089

(35) 3456-1238

prefeitura.naterciac@hotmail.com

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

10.1 - NOME

10.2 - REGISTRO  
PROFISSIONAL

10.3 - TELEFONE

10.4 - E-MAIL

DANIELLE MAYRA DA CRUZ

1296

(35) 3456-1238

danyntc@hotmail.com

**12 - Obrigações do interveniente (se houver):**

Análise técnica e jurídica para a celebração do convênio, acompanhamento e fiscalização da execução do convênio, e análise da prestação de contas.

**V - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO****1 META: REFORMA OU OBRA - Calçamento - Vias Públicas****1.1 REFORMA OU OBRA - Calçamento - Vias Públicas****ETAPA**Duração  
(Dias Corridos)

1.1.1 - Fornecimento e colocação de placa de obra.

30

1.1.2 - Calçamento em blocos de concreto.

90

1.1.3 - Sarjeta

90

**2 META: AMPLIAÇÃO DE META FÍSICA****2.1 REFORMA OU OBRA - Calçamento - Vias Públicas****ETAPA**Duração  
(Dias Corridos)

2.1.1 - FORNECIMENTO DA PLACA

30

2.1.2 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

30

2.1.3 - CALÇAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO

30

2.1.4 - CALÇAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO DE E 6

30

2.1.5 - RETIRADA E REASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO

30

2.1.6 - MEIO FIO E SARJETA

30

**ALTERAÇÃO DE CONVÊNIO/PARCEIRA**

NÚMERO DE REGISTRO DO SIGCON-SAÍDA: 5191000053/2016

DATA DO REGISTRO: 21/12/2018

**V - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

## AMPLIAÇÃO DE META FÍSICA

2.1.7 - SARJETA TIPO 1

2.1.8 - MEIO FIO DE CONCRETO

2.1.9 - REMOÇÃO DE MEIO FIO

FLS.:

440

30

30

30

**3. META: AMPLIAÇÃO DE METAS****3.1 REFORMA OU OBRA - Calçamento - Vias Públicas****ETAPA**

3.1.1 - INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA -

3.1.2 - OBRAS VIÁRIAS ( PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

3.1.3 - DRENAGEM

3.1.4 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Duração  
(Dias Corridos)

30

60

60

30

**VI - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS****1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO**

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                | UNID. DE MEDIDA | QUANT. | VALOR<br>(ANTERIOR + ALTERAÇÃO) |                | TIPO DESPESA | ETAPAS<br>VINCULADAS | EQUIPE DE<br>TRABALHO |
|------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|
|      |                                                          |                 |        | UNITÁRIO                        | TOTAL          |              |                      |                       |
| 1    | Fornecimento e colocação de placa de obra.               | un              | 1      | R\$ 2.772,89                    | R\$ 2.772,89   | Serviço      | 1.1.1                | Não                   |
| 2    | Calçamento em blocos de concreto intertravado.           | un              | 1      | R\$ 130.471,56                  | R\$ 130.471,56 | Serviço      | 1.1.2                | Não                   |
| 3    | Calçamento em bloquete                                   | un              | 1      | R\$ 144.096,54                  | R\$ 144.096,54 | Serviço      | 1.1.3                | Não                   |
| 4    | Calçamento em paralelepípedo, retirada e reassentamento. | un              | 1      | R\$ 43.976,18                   | R\$ 43.976,18  | Serviço      | 2.1.1                | Não                   |
| 5    | Calçamento em bloquete, retirada e reassentamento        | un              | 1      | R\$ 127.297,50                  | R\$ 127.297,50 | Serviço      | -                    | Não                   |
| 6    | Sarjeta                                                  | un              | 1      | R\$ 39.607,97                   | R\$ 39.607,97  | Serviço      | -                    | Não                   |
| 7    | Regularização do sub-leito com proctor normal            | un              | 1      | R\$ 2.593,43                    | R\$ 2.593,43   | Serviço      | -                    | Não                   |
| 8    | Meio fio e sarjeta                                       | un              | 1      | R\$ 46.627,76                   | R\$ 46.627,76  | Serviço      | -                    | Não                   |
| 9    | Meio fio de concreto pre-moldado                         | un              | 1      | R\$ 1.637,01                    | R\$ 1.637,01   | Serviço      | -                    | Não                   |
| 10   | Remoção de meio fio                                      | un              | 1      | R\$ 2.555,29                    | R\$ 2.555,29   | Serviço      | -                    | Não                   |

**ALTERAÇÃO DE CONVÊNIO/PARCERIA**

NÚMERO DE REGISTRO DO SIGCON-SAÍDA: 5191000053/2016

DATA DO REGISTRO: 21/12/2018

FLS.:  
441**2 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA/CONTRAPARTIDA**

| ESPECIFICAÇÃO                          | VALOR ANTERIOR        | VALOR ALTERAÇÃO      | VALOR ATUALIZADO<br>(ANTERIOR + ALTERAÇÃO) | %CONVÊNIO | % LDO |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------|-------|
| Concedente/Órgão<br>/Entidade Parceira | R\$ 500.000,00        | R\$ 0,00             | R\$ 500.000,00                             | 92,31     | -     |
| Parlamentar                            | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                                   | 0,00      | -     |
| Interveniente                          | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                                   | 0,00      | -     |
| Contrapartida                          | R\$ 7.597,08          | R\$ 0,00             | R\$ 7.597,08                               | 1,40      | 1,52  |
| Rendimentos                            | R\$ 0,00              | R\$ 34.039,05        | R\$ 34.039,05                              | 6,28      | -     |
| Saldo em conta                         | R\$ 0,00              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                                   | -         | -     |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 507.597,08</b> | <b>R\$ 34.039,05</b> | <b>R\$ 541.636,13</b>                      |           |       |

**VII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS****CONCEDENTE/ÓRGÃO OU ENTIDADE ESTADUAL PARCEIRO**

| Mês   | Ano  | Valor          |
|-------|------|----------------|
| Março | 2016 | R\$ 350.000,00 |
| Julho | 2016 | R\$ 150.000,00 |

**CONTRAPARTIDA**

| Mês   | Ano  | Valor        |
|-------|------|--------------|
| Março | 2016 | R\$ 5.317,95 |
| Julho | 2016 | R\$ 2.279,13 |

**VIII - DECLARAÇÃO**

Na qualidade de representante legal do Conveniente/OSC Parceira, declaro, para fins de prova junto ao Concedente/Órgão ou Entidade Estadual Parceiro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Estado de Minas Gerais que impeça a transferência de recursos de dotações consignadas no pagamento estadual.

NITERÓIA

Local

26/02/19

Data

Assinatura do Representante Legal do  
Conveniente/OSC ParceiraCristiano Antonio Sartore Junior  
Nome Legível do Responsável Legal do Conveniente e  
Nº do Documento de identificação ou Carimbo**IX - RESERVADO AO CONCEDENTE**


# ALTERAÇÃO DE CONTEÚDO PARCERIA

NÚMERO DE REGISTRO DO SIGCON-SAÍDA: 5191000053/2016

DATA DO REGISTRO: 21/12/2018

## PARECER TÉCNICO

Sector Análise: Setor de Engenharia  
Responsável: LUCIANA COSTA PEREIRA  
Data: 22/02/2019  
Status do Parecer: Favorável



Trata-se de Termo Aditivo ao convênio 5191000053/2016 ? ampliação de metas, conforme ofícios Nº 40/2018, datado em 19 de setembro de 2018, fl. 285, e 46/2018, datado 18 de dezembro de 2018 e justificativa técnica as fls. 354 e 355, com utilização de saldo financeiro proveniente de ganhos de eficiência no processo licitatório e rendimentos financeiros, conforme apurado no demonstrativo de rendimentos que compõe a Guia de Conferência da Documentação de Termo Aditivo emitido pela Diretoria de Gestão de Convênios - fls. 339. A documentação técnica apresentada, de responsabilidade do profissional Ludmar Gonçalves de Sousa, registrado no CREA/MG nº 49108/D, encontra-se elaborada de acordo com as normas vigentes. Os preços adotados na planilha orçamentária dos serviços a serem executados estão compatíveis com aqueles constantes da Tabela Referencial de Preços Unitários da SETOP para a Região Sul, vigente a partir de outubro de 2018 com desoneração. Conforme relatório de vistoria/monitoramento as fls. 250 a 262, a obra encontra-se com 100 % dos seus serviços executados obra concluída, emitido pelo Município e assinado pelo responsável técnico, Ludmar Gonçalves de Sousa, registrado no CREA/MG nº 49108/D. Mediante a solicitação do termo aditivo de ampliação de metas com a realização de novo processo licitatório, opino ser necessária à prorrogação de vigência até a data de 29/01/2020. Diante do exposto, esta Superintendência de Coordenação Técnica opina favoravelmente a celebração do termo aditivo. Meta serviços executados: Execução de 2.104,38m² de calçamento em blocos de concreto intertravado, 517,45m² de calçamento em bloquetes, 7.479,85 m² de retirada e reassentamento de paralelepípedo, 26 m² de retirada e reassentamento de bloquetes, 3.291,61 m de sarjeta. Meta serviços a executar: Execução de 2.253,64 m² de calçamento em bloquetes, 420 m² de retirada e reassentamento de bloquetes, 620,05 m de meio-fio e sarjeta, 27,00 m de meio fio e 300,00 m sarjeta Local: Ruas José Teodoro dos Reis (trecho 01 e 02), Geraldo Honorato de Souza e Pedro Eufrásio Neto. Valor do Convênio: R\$ 507.597,08 Valor da Planilha dos Serviços Executados: R\$ 357.483,23 Valor da Planilha dos Serviços a Executar: R\$ 184.152,90 Rendimentos Financeiros: R\$ 34.039,05 Valor final do convênio: R\$ 541.636,13 OBS.: a) A análise técnica dos documentos não caracteriza corresponsabilidade, já que a responsabilidade técnica pelo projeto, orçamento e fiscalização é de seu autor, conforme Anotação de Responsabilidade Técnica emitida de nº 14201900000005002399 e instruída no processo. b) Declaramos que este parecer técnico não exime a empresa contratada pelo Conveniente da responsabilidade de nova revisão do projeto a fim de garantir a estabilidade e a segurança da obra.

Luciana Costa Moreno  
Responsável pela Análise Técnica

M.1.208.837-3  
Carimbo de identificação 26/02/2019  
Data

Luciene Buldrini Barbosa  
Responsável pela Aprovação da Análise Técnica

Luciene Buldrini Barbosa  
Diretora de Custos  
Masp 1206469-7  
Carimbo de identificação 26/02/2019  
Data

## ALTERAÇÃO DE CONVÊNIO/PARCERIA

NÚMERO DE REGISTRO DO SIGCON-SAÍDA: 5191000053/2016

DATA DO REGISTRO: 21/12/2018

### PARECER JURÍDICO

Responsável: GILCILENE CRISTINE RICARDO

Data: 10/04/2019

Status do Parecer: Favorável

Diante do exposto e das declarações constantes da pasta administrativa, em especial as Nota Técnica nº 18, emitidas pela área técnica responsável pelo presente expediente, na sua esfera de atribuição das quais não nos cabe conferir a legitimidade ou emitir juízo de valor, esta Assessoria opina pela possibilidade jurídica da celebração do 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 5191000053/2016 para fins de ampliação do objeto e prorrogação do prazo de vigência, desde que cumpridas as seguintes ressalvas: a) Certifique-se a área técnica competente que o pedido de ampliação de metas se coaduna com o núcleo de finalidade do convênio; b) Manifeste-se a área técnica de maneira objetiva acerca da aprovação da ampliação de metas pretendida pelo convenente; c) Certifique-se a unidade técnica competente de que o convenente mantém a regularidade cadastral junto ao CAGEC, CADIN e SIAFI.

**Gilcilene Cristine Ricardo**  
Assessora Jurídica - SETOP  
MASP 1104710-4

Carimbo de identificação

10/4/19

Data

Responsável pela Análise Jurídica

Carimbo de identificação

10/4/19

Data

Responsável pela Aprovação da Análise Jurídica

**Matheus Fernandes F. Couto**  
Procurador do Estado  
OAB/MG 143.410 - MASP 1.327.036-8

**ALTERAÇÃO DE CONVENIO PARCERIA**

SETOR

Fls. 463

NÚMERO DE REGISTRO DO SIGCON-SAÍDA: 5191000053/2016

DATA DO REGISTRO: 21/12/2018

ASS. **CONFERÊNCIA E APROVAÇÃO**

A alteração está de acordo com o art. 116 da Lei Federal nº 8.666/1993, com o Decreto 46.319/2013 e com a Resolução Conjunta SEGOV-AGE nº 004/2015, podendo ser aprovada. Destacam-se as análises técnica(s) e jurídica pelos setores competentes.

Responsável pela conferência da alteração

Adair Carlos S. Soares  
Diretor de Gestão de Convênios  
Masp. 350.052-7

Carimbo de identificação

25/04/19

Data

Aprovo e autorizo a publicação da Alteração do Convênio


Responsável Legal do Concedente


Marco Aurélio de Barcelos Silva  
Secretário de Estado de  
Transportes e Obras Públicas  
Masp. 1.085.178-0

Carimbo de identificação

25/04/19

Data

  
Antônio Estácio da Silva  
Diretor-Presidente

  
Maria Alice dos Santos  
Diretora Administrativo - Finanças  
e Relações com Investidores







### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

|                                                                                    |  |  |  |  |                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------|----------------|
| ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA                  |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01    |                |
| OBRA: AMPLIAÇÃO DE META FÍSICA DO CONVENIO Nº 5619100053/2016                      |  |  |  |  | DATA: 14/12/2018   |                |
| LOCAL: RUA JOSE TEODORA DOS REIS - GERALDO HONORATO DE SOUZA - PEDRO EUFRASIO NETO |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |                |
| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO / 2018                                             |  |  |  |  | ( ) DIRETA         | ( X ) INDIRETA |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS                                                         |  |  |  |  | LDI                | 23,99%         |

| ITEM                | CÓDIGO      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI           | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL |
|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1.0                 | HO-001      | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |                                 |                       |             |
| 1.1                 | HO-PLA-005  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIÇADAS COM REBITES #40 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20. SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NA FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS. | UN      | 1,00       | 1.077,12                        | 1.335,52              | 1.335,52    |
| 2.0                 | OBR-001     | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |                                 |                       |             |
| 2.1.1               | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2      | 2.673,64   | 0,78                            | 0,97                  | 2.593,43    |
| 2.1                 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 25 MPa, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM                                                                                                                                                                                                                                | m2      | 887,44     | 44,48                           | 55,15                 | 48.942,32   |
| 2.2                 | OBR-VIA-210 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 25 MPa, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM                                                                                                                                                                                                                                | m2      | 1.366,20   | 38,76                           | 48,06                 | 65.559,57   |
| 2.3                 | OBR-VIA-208 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2      | 420,00     | 21,09                           | 26,15                 | 10.983,00   |
| 3.0                 | DRE-001     | DRENAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                 |                       |             |
| 3.1                 | DRE-SAR-005 | MEIO-FIO E SARJETA (15 X 30) CM, MOLDADO IN LOCO CONCRETO FCK = 15 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M       | 620,05     | 60,65                           | 75,20                 | 46.627,76   |
| 3.2                 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 50X5 CM, I = 3% PADRA DEER MG (PREÇO REAJUSTADO PARA LARGURA DE 30 CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M       | 300,00     | 10,27                           | 12,73                 | 3.819,00    |
| 3.3                 | DRE-SAR-020 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 46) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M       | 27,00      | 48,90                           | 60,63                 | 1.637,01    |
| 4.0                 | DEM-001     | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |                                 |                       |             |
| 4.1                 | DEM-MFC-005 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M       | 294,05     | 7,01                            | 8,69                  | 2.555,29    |
| 4.2                 | RO - 42387  | REMOÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS (BLOQUETES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2      | 540,00     | A GARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL |                       |             |
| 4.3                 | RO-41209    | REMOÇÃO E CARGA DO REVESTIMENTO ASFALTICO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2      | 887,44     | A GARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL |                       |             |
| TOTAL GERAL DA OBRA |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |                                 |                       | 184.152,90  |

Ludmar Gonçalves de Sousa

CREA - MG 49108/D

UFMG - 1988

CREA

LUDMAR GONÇALVES DE SOUSA

Cristiano Antônio C. Junho  
Prefeito Municipal

CRISTIANO ANTONIO CAETANO JUNHO

C. P: 445.403.500-15
